

**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA****SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT****Pág. 1 de 33****INFORME DE SUPERVISIÓN****GRADO DE RESPONSABILIDAD**

- Mediante la suscripción del presente informe, el supervisor técnico asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, desde la fecha de asignación.

Fecha:	19	de	Agosto	de	2026
--------	----	----	--------	----	------

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONTRATO	X	CONVENIO	
CONTRATO NÚMERO:	4875	De	16/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO: “CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMRGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”.			
SUPERVISOR:	JULIO CESAR GALLO ORTIZ		
CONTRATISTA Y/O COOPERANTE:	UNION TEMPORAL MARV 6		
VALOR DEL CONTRATO	MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (\$1.419.653.226,68) M/CTE IVA INCLUIDO		
ADICIONAL AL CONTRATO	SESENTA Y OCHO MILONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL VEINTITRES PESOS M/CTE (\$ 68.616.023,00) IVA INCLUIDO.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$1.488.269.249,68) IVA INCLUIDO.		
DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTIUN (21) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.		
PRORROGA 01 AL CONTRATO:	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO.		
PRORROGA 02 AL CONTRATO:	DIEZ (10) DIAS CALENDARIO.		



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 2 de 33

INFORME DE SUPERVISIÓN

DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO	NOVENTA Y UN (91) DIAS CALENDARIO. CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
Fecha de Legalización:	22 DE DICIEMBRE DE 2025
Acta de Inicio:	22 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de Terminación:	14 DE MARZO DE 2026
Acta de Recibo Final del Contrato:	16 DE JUNIO DE 2026
Acta de Liquidación:	06 DE JULIO DE 2025

A. ESTADO A LA FECHA: EL PROCESO A LA FECHA DE ESTE INFORME SE ENCUENTRA LIQUIDADO.

B. RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL:

1. La fecha de inicio del contrato fue el día 22 de diciembre del 2025 y se encuentra en liquidado.
2. Se suscribió el Acta 001 (MODIFICATORIA), mediante la cual se aclaro el valor del CDP en la minuta, el cual había sido digitado erróneamente.
3. Se suscribió el Acta 001 (ACTA MODIFICATORIA), mediante la cual se prorrogó el plazo del contrato en sesenta (60) días calendario, quedando como un plazo de ejecución de ochenta y un (81) días calendario.
4. Se suscribió el Acta 002 (ACTA MODIFICATORIA), mediante la cual se adiciona el contrato por un valor en valor en SESENTA Y OCHO MILONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL VEINTITRES PESOS M/CTE (\$ 68.616.023,00) IVA INCLUIDO. y se prorrogó por DIEZ (10) DIAS CALENDARIO, quedando un valor total de ejecución de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$1.488.269.249,68) IVA INCLUIDO. y un plazo total de NOVENTA Y UN (91) DIAS CALENDARIO contados a partir del acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual.
5. Se suscribió el Acta de Recibo Final el día 16 de Junio de 2026, las actividades del contrato se terminaron el día 14 de Marzo de 2026.
6. Se suscribió el Acta de Liquidación el día 06 de Julio de 2026.
7. ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA:
 - En el periodo comprendido entre el 22 de Diciembre de 2025 y el 14 de Marzo de 2026 se ha realizado la siguiente intervención en vías a cargo del Departamento y a cargo del municipio.

- ✓ Se realizo un total de 41,8 Km de Mantenimiento y/o mejoramiento de vías de Segundo Orden a cargo del Departamento.



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 3 de 33

INFORME DE SUPERVISIÓN

- ✓ Se realizó un total de 40,9 Km de Mantenimiento y/o mejoramiento de vías de Tercer Orden a cargo del Departamento.
- ✓ Se realizó un total de 98,5 Km de Mantenimiento y/o mejoramiento de vías de Tercer Orden a cargo del Municipio

CONTRATO 4875 DEL 2025 - PERIODO 22 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 13 DE MARZO DEL 2026					
MANTENIMIENTO VIAL AÑO 2025 - 2026					
MUNICIPIO	VIA INTERVENIDA	FECHA DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	MAQUINARIA UTILIZADA	KM DE VIA INTERVENIDOS
ATACO	CONDOR - PAUJIL - MONTELORO	26 de Diciembre del 2025 - 28 de Diciembre del 2025	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Retroexcavadora 2Volquetas	1
	CONDOR - PAUJIL - MONTELORO	05 de Enero 2026 - 28 de Enero 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Retroexcavadora 2Volquetas	4
	CONDOR-MONTELORO-LA TRIBUNA	02 de Febrero del 2026 - 25 de Febrero 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	5,5
	ATACO - CONDOR-MONTELORO-LA TRIBUNA	03 de Marzo del 2026 - 13 de MARZO 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	2,5
CHAPARRAL	BETANIA-BRUSELAS-EL LIMÓN	05 de Febrero del 2026 - 26 de Febrero 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	13
	BETANIA-BRUSELAS-EL LIMÓN	03 de Marzo del 2026 - 12 de MARZO 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	3,5
CAJAMARCA	ANAIME	26 de Diciembre del 2025 - 30 de Diciembre del 2025	Se realizaron actividades de apoyo a la Alcaldía en conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	2,5
	ANAIME	05 de Enero 2026 - 06 de Enero 2026	Se realizaron actividades de apoyo a la Alcaldía en conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	0,9
DOLORES	PRADO - DOLORES	26 de Diciembre del 2025 - 30 de Diciembre del 2025	Se realizaron actividades de apoyo a la Alcaldía en conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	1



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 4 de 33

INFORME DE SUPERVISIÓN

	PRADO - DOLORES	06 de Enero del 2025 - 29 de Enero 2026	Se realizaron actividades de apoyo a la Alcaldía en conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	6
	PRADO - DOLORES	16 de Febrero del 2026 - 26 de Febrero 2026	Se realizaron actividades de apoyo a la Alcaldía en conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	4
	SAN JUAN	05 de Marzo del 2026 - 06 de Marzo 2026	Se realizaron actividades de apoyo a la Alcaldía en conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	1
HERVEO	HERVEO - TULCAN	10 de Febrero del 2026 - 22 de Febrero 2026	Se realizaron actividades de apoyo a la Alcaldía en conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora	4
	HERVEO - TULCAN	02 de Marzo del 2026 - 09 de Marzo 2026	Se realizaron actividades de apoyo a la Alcaldía en conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora	1
IBAGUE	TAPIAS	07 de Enero del 2025 - 17 de Enero 2026	Se realizaron actividades de apoyo a la Alcaldía en conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	5
	LA TIGRERA-BOQUERÓN-TÚNELES	24 de Febrero del 2026 - 28 de Febrero 2026	Se realizaron actividades de apoyo a la Alcaldía en conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	3,5
	LA TIGRERA-EL CURAL-TÚNELES	02 de Febrero del 2026 - 23 de Febrero 2026	Se realizaron actividades de apoyo a la Alcaldía en conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	4,8
	SAN SIMON - TAPIAS	02 de Marzo del 2026 - 03 de Marzo 2026	Se realizaron actividades de apoyo a la Alcaldía en conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	1,7
	SAN SIMON - TUNELES - TAPIAS	04 de Marzo del 2026 - 13de Marzo 2026	Se realizaron actividades de apoyo a la Alcaldía en conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	2
ICONONZO	CAFRERÍA-HOYAGRANDE	02 de Febrero del 2026 - 20 de Febrero 2026	Se realizaron actividades de apoyo a la Alcaldía en conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de	Retroexcavadora 1Volquetas	3,6



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 5 de 33

INFORME DE SUPERVISIÓN

			material explotado para extender sobre la vía.		
	ICONONZO	02 de Marzo del 2026 - 07 de Marzo 2026	Se realizaron actividades de apoyo a la Alcaldía en conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Retroexcavadora 1Volquetas	1,5
VILLAHERMOSA	VILLAHERMOSA - CASABIANCA	09 de Febrero del 2026 - 25 de Febrero 2026	Se realizaron actividades de apoyo a la Alcaldía en conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	10,3
	VILLA HERMOSA - BUENAVISTA	02 de Marzo del 2026 - 06 de Marzo 2026	Se realizaron actividades de apoyo a la Alcaldía en conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	4,5
LIBANO - VILLAHERMOSA	VILLAHERMOSA-LA SAMARIA	22 de Diciembre del 2025 - 23de Diciembre del 2025	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 1Volquetas	1,5
	LIBANO - VILLAHERMOSA	24 de Diciembre del 2025 - 29 de Diciembre del 2025	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 1Volquetas	5
	LIBANO - VILLAHERMOSA	09 de Enero 2026 - 28 de Enero 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 1Volquetas	5,5
NATAGAIMA	VEREDAS NATAGAIMA	22 de Diciembre del 2025 - 23 de Diciembre del 2025	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Retroexcavadora 2Volquetas	0,8
	VEREDAS NATAGAIMA	05 de Enero 2026 - 30 de Enero 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Retroexcavadora 2Volquetas	2
	VELÚ-ANACARCO-MERCADILLO	02 de Febrero del 2026 - 26 de Febrero 2026	Se realizaron actividades de apoyo a la Alcaldía en conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Retroexcavadora Volqueta	5
	VELÚ-ANACARCO-MERCADILLO - TINAJAS	02 de Marzo del 2026 - 13 de Marzo 2026	Se realizaron actividades de apoyo a la Alcaldía en conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Retroexcavadora Volqueta	1,8



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 6 de 33

INFORME DE SUPERVISIÓN

ORTEGA	MAQUITO	26 de Diciembre del 2025 - 30 de Diciembre del 2025	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	2,3
	MAQUITO	05 de Enero 2026 - 15 de Enero 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	3,5
PLANADAS	BILBAO - HERRERA (PATAGONIA)	26 de Diciembre del 2025 - 30 de Diciembre del 2025	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora 1Volquetas	2
	BILBAO - HERRERA (PATAGONIA)	05 de Enero 2026 - 28 de Enero 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora 1Volquetas	5
	GAITANIA	02 de Febrero del 2026 - 22 de Febrero 2026	Se realizaron actividades de apoyo a la Alcaldía en conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	5
	BILBAO (LA CRISTALINA, BETULIA)	23 de Febrero del 2026 - 26 de Febrero 2026	Se realizaron actividades de apoyo a la Alcaldía en conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	3
	BILBAO (LA CRISTALINA, SAN JORGE)	02 de Marzo del 2026 - 05 de Marzo 2026	Se realizaron actividades de apoyo a la Alcaldía en conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	3
RIOBLANCO	CHAPARRAL - RIOBLANCO	12 de Enero 2026 - 30 de Enero 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	4
	RIOBLANCO - HERRERA	09 de Febrero del 2026 - 13 de Febrero 2026	Se realizaron actividades de apoyo a la Alcaldía en conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	2
	VEREDA CRUZ VERDE	16 de Febrero del 2026 - 27 de Febrero 2026	Se realizaron actividades de apoyo a la Alcaldía en conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	5
	RIOBLANCO - ATACO	02 de Marzo del 2026 - 13 de Marzo 2026	Se realizaron actividades de apoyo a la Alcaldía en conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	3,5



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 7 de 33

INFORME DE SUPERVISIÓN

ROVIRA	PLAYARRICA - ROVIRA	02 de Febrero del 2026 - 12 de Febrero 2026	Se realizaron actividades de apoyo a la Alcaldía en conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	4
RONCESVALLES	ROSALES	26 de Diciembre del 2025 - 30 de Diciembre del 2025	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	2Volquetas Retroexcavadora Vibrocompactador Motoniveladora	2
	ROSALES	06 de Enero 2026 - 15 de Enero 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	4
SALDAÑA	CHUCARON	02 de Marzo del 2026 - 13 de Marzo 2026	Se realizaron actividades de apoyo a la Alcaldía en conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	2,5
SUAREZ	SUAREZ – PURIFICACIÓN	02 de Febrero del 2026 - 12 de Febrero 2026	Se realizaron actividades de apoyo a la Alcaldía en conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	12
	SUAREZ – EL PASO	16 de Febrero del 2026 - 22 de Febrero 2026	Se realizaron actividades de apoyo a la Alcaldía en conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	5
VILLARRICA	VILLARRICA - CUNDAY	05 de Enero 2026 - 28 de Enero 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	5

MANTENIMIENTO VIAL - DICIEMBRE 2025 - MARZO 2026	181,2
--	-------

Mejoramiento Vías Segundo Orden a cargo del Departamento (Km)	41,8
Mejoramiento Vías Tercer Orden a cargo del Departamento (Km)	40,9
Mejoramiento Vías Tercer Orden a cargo del Municipio (Km)	98,5

C. PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA:

PORCENTAJE DE EJECUCION	100 %
-------------------------	-------

El presente informe se emite para detallar las actividades realizadas en la ejecución del Contrato N° 4875 de 2025.



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 8 de 33

INFORME DE SUPERVISIÓN

D. REGISTRO FOTOGRAFICO:

Municipio del Ataco



CONDOR-PAUJIL-MONTELORO



CONDOR-PAUJIL-MONTELORO



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 9 de 33

INFORME DE SUPERVISIÓN



CONDOR-PAUJIL-MONTELORO



CONDOR-PAUJIL-MONTELORO



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 10 de 33

INFORME DE SUPERVISIÓN



CONDOR-PAUJIL-MONTELORO



CONDOR-PAUJIL-MONTELORO



INFORME DE SUPERVISIÓN



CONDOR-PAUJIL-MONTELORO



CONDOR-PAUJIL-MONTELORO



INFORME DE SUPERVISIÓN

Municipio de Chaparral



ICARCO-LA HOLANDA



ICARCO-LA HOLANDA



INFORME DE SUPERVISIÓN



ICARCO-LA HOLANDA



ICARCO-LA HOLANDA



INFORME DE SUPERVISIÓN

Municipio de Herveo



HERVEO



HERVEO



INFORME DE SUPERVISIÓN



HERVEO



HERVEO



INFORME DE SUPERVISIÓN



HERVEO



HERVEO



INFORME DE SUPERVISIÓN

Municipio de Icononzo



EL TRIUNFO-CAFRERÍA





INFORME DE SUPERVISIÓN



EL TRIUNFO-CAFRERÍA



EL TRIUNFO-CAFRERÍA



INFORME DE SUPERVISIÓN



EL TRIUNFO-CAFRERÍA



EL TRIUNFO-CAFRERÍA



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 20 de 33

INFORME DE SUPERVISIÓN

Municipio de Ibagué



TAPIAS



TAPIAS



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 21 de 33

INFORME DE SUPERVISIÓN



TAPIAS



TAPIAS



INFORME DE SUPERVISIÓN



TAPIAS



TAPIAS




GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 23 de 33

INFORME DE SUPERVISIÓN

Municipio de Ortega

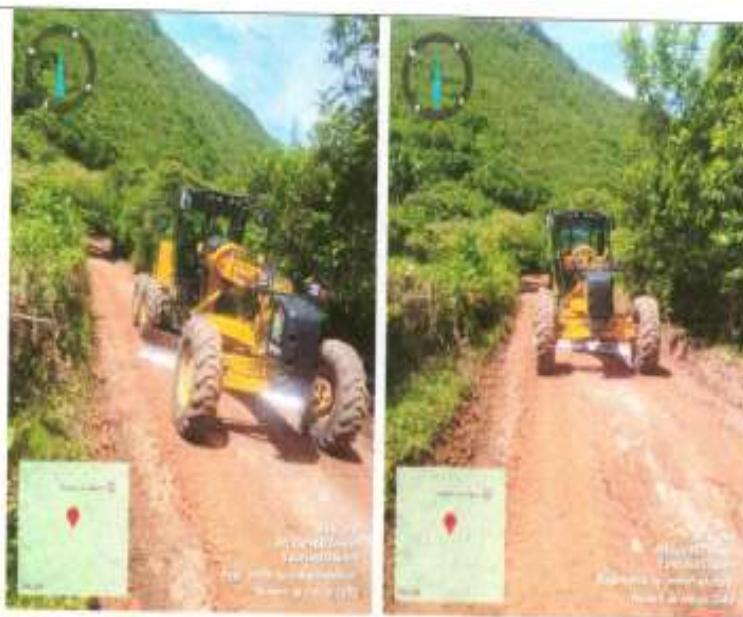

MAQUITO



MAQUITO



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 24 de 33

INFORME DE SUPERVISIÓN



MAQUITO



MAQUITO



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 25 de 33

INFORME DE SUPERVISIÓN



MAQUITO



MAQUITO



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 26 de 33

INFORME DE SUPERVISIÓN

Municipios del Líbano – Villahermosa



VILLAHERMOSA-LA SAMARIA/LÍBANO-VILLAHERMOSA



VILLAHERMOSA-LA SAMARIA/LÍBANO-VILLAHERMOSA



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 27 de 33

INFORME DE SUPERVISIÓN



VILLAHERMOSA-LA SAMARIA/LÍBANO-VILLAHERMOSA



VILLAHERMOSA-LA SAMARIA/LÍBANO-VILLAHERMOSA



INFORME DE SUPERVISIÓN



VILLAHERMOSA-LA SAMARIA/LÍBANO-VILLAHERMOSA



VILLAHERMOSA-LA SAMARIA/LÍBANO-VILLAHERMOSA



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 29 de 33

INFORME DE SUPERVISIÓN

Municipio de Natagaima





INFORME DE SUPERVISIÓN





INFORME DE SUPERVISIÓN

Municipio de Planadas

6.1 ACTIVIDADES EN PLANADAS



BILBAO - HERRERA



BILBAO - HERRERA



INFORME DE SUPERVISIÓN



BILBAO - HERRERA



BILBAO - HERRERA



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 33 de 33

INFORME DE SUPERVISIÓN




BILBAO - HERRERA



BILBAO - HERRERA


JULIO CÉSAR GALLO ORTIZ
Supervisor del Convenio
Director de infraestructura-SIH


JUAN SEBASTIAN ORTIZ PEÑUELA
Apoyo a la Supervisión
