

	CONTRATO DE OBRA No.68573-007-2020 (PAF-MEN-O-074-2019) (CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S)	INFORME MENSUAL No.6 ETAPA II	SEDE No.: 38 I.E. TÉCNICA FRANCISCO JULIÁN OLAYA SEDE: EL DANUBIO DEPARTAMENTO: TOLIMA MUNICIPIO: RIOBLANCO
OBJETO: "VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 5 CENTRO SUR (CAQUETÁ, FLORENCIA, HUILA, PUTUMAYO Y TOLIMA)"			

ANEXO 04 – REGISTRO FOTOGRÁFICO SEDE DANUBIO I.E T. FRANCISCO JULIAN OLAYA RIOBLANCO



Foto 1. Instalación de enchape de piso en aula 1



Foto 2. Instalación de ventana en lámina llena



Foto 3. Enchape de piso y paredes en cocina



Foto 4. Pintura exterior en muros



Foto 5. Pintura interna en aula de clase



Foto 6. Pintura en carpintería metálica

	CONTRATO DE OBRA No.68573-007-2020 (PAF-MEN-O-074-2019) (CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S)	INFORME MENSUAL No.6 ETAPA II	SEDE No.: 38 I.E. TÉCNICA FRANCISCO JULIÁN OLAYA SEDE: EL DANUBIO DEPARTAMENTO: TOLIMA MUNICIPIO: RIOBLANCO
OBJETO: "VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 5 CENTRO SUR (CAQUETÁ, FLORENCIA, HUILA, PUTUMAYO Y TOLIMA)"			



Foto 7. Instalación de cielo raso en aula de sistemas

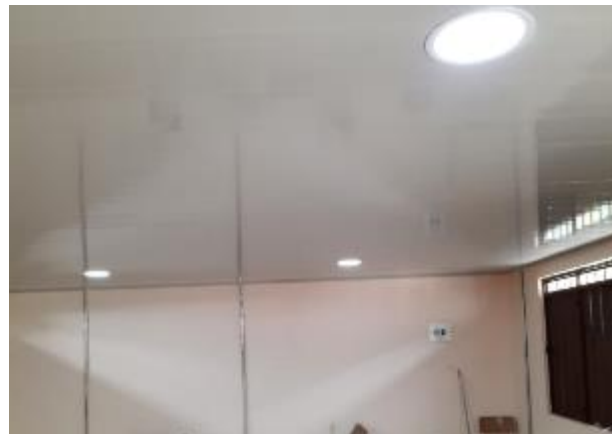


Foto 8. Instalación balas led en cielo raso



Foto 9. Instalación de tubería EMT para red eléctrica



Foto 10. Instalación de tomacorrientes



Foto 11. Instalación de interruptores



Foto 12. Instalación de tomacorrientes

**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A
SATISFACCIÓN
I.E. TÉCNICA FRANCISCO JULIAN OLAYA –
EL DANUBIO
RIOBLANCO - TOLIMA
CONTRATO DE OBRA No.68573-007-2020
(PAF-MEN-O-074-2019)**

Código: ADTI-FO-065
Versión: 1
Fecha de aprobación: 11-
Ago-2017

CONTRATO ☐ PROYECTO ☒ FASE/ETAPA ☒ No. 2

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO	VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNOSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MEN, GRUPO 5, CENTRO SUR (CAQUETÁ, FLORENCIA, HUILA, PUTUMAYO Y TOLIMA)
NÚMERO DEL CONTRATO OBRA	68573-007-2020 (PAF-MEN-O-074-2019)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	MEJORAMIENTO EN EL I.E. TÉCNICA FRANCISCO JULIAN OLAYA – SEDE DANUBIO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, DEPARTAMENTO TOLIMA
CONTRATISTA	CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S.
INTERVENTOR	ARQDILAM CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
SUPERVISOR ETAPA 2	ING. MARCELLA PATRICIA PEREZ MENDOZA
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO (E1 + E2)	CINCO (05) MESES
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO / Etapa 1	UN (1) MES
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO / Etapa 2	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	06 DE NOVIEMBRE DE 2020
PRÒRROGA NO.1	VEINTIDOS (22) DIAS
PRÒRROGA NO.2	VEINTE (20) DIAS
SUSPENSIÓN NO.1	TREINTA (30) DIAS
SUSPENSIÓN NO.2	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO	02 DE FEBRERO DE 2021

Una vez verificados los productos o servicios objeto de la FASE 2 por parte de la interventoría **ARQDILAM CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**, se procede a certificar la ejecución de toda la obra y cada una de las actividades integrales de los capítulos de obra empleados para construcción de obra civil donde se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas insertadas en el contrato de obra No. **68573-007-2020 (PAF-MEN-O-074-2019)** y se certifica la calidad y funcionalidad de los espacios construidos y puestos en funcionamiento en el **I.E. TÉCNICA FRANCISCO JULIAN OLAYA – SEDE EL DANUBIO**, MUNICIPIO DE RIOBLANCO– TOLIMA, y que no se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita.


En consecuencia, el objeto de la FASE No. 2 se relacionan el siguiente desglose de ítems ejecutados:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL
I	ÍTEMSCONTRACTUALES		
1	PRELIMINARES		
1,4	ACOMETIDA DOMICILIARIAS ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	25,22
1,28	PICADA DE PAÑETE (INCLUYE RETIRO)	M2	13,59
2	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS		
2,3	DESALOJO MATERIAL SOBRANTE HASTA 10 KM	M3	0,68
4	PISOS Y ENCHAPES		
4,7	ENCHAPE CERÁMICA PISO, ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁFICO	M2	100,37
4,8	ENCHAPE CERÁMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	M2	21,52
4,9	GUARDAESCOBA EN CERÁMICA	M	49,00
5	MAMPOSTERÍA, PAÑETE, MUROS EN SUPERBOARD Y DRY WALL		
5,15	PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E = 0,015 M, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	M2	19,86
6	ACABADOS Y PINTURA		
6,4	ESTUCO INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	122,66
6,10	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	M2	122,66
6,11	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	M2	238,39
6,12	REPOSICION ZOCALO FACHADA (H > 0.40M)	M	94,01
6,13	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	M2	41,78
7	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
7,12	VENTANA EN LAMINA CALIBRE 20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	8,89
7,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA TIPO BANCO EN VARILLA CUADRADA	M2	39,17


8	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		
8,24	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	50,63
10	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
10,3	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (INTERRUPTOR Y TOMA)	UN	12,00
10,4	TUBERIA EMT 3/4	M	42,00
10,15	SALIDA PARA ILUMINACIÓN	UN	6,00
10,18	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	UN	2,00
12	URBANISMO, EXTERIORES Y OTROS		
12,8	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	GL	1,00
II	ÍTEM SNOPREVISTOS		
1	PRELIMINARES		
NP-1.29	DEMOLICIÓN ENCHAFE DE PARED, INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS DEMOLICIONES A PUNTO DE ACOPIO NO MAYOR A 25 M INTERNO	M2	7,39
NP-4	PISOS Y ENCHAPES		
NP-4.15	BOCAPUERTA EN GRANITO LAVADO, ESPESOR HASTA 0.01 M Y ANCHO HASTA 0.20 M.	M	2,88
NP-6	ACABADOS Y PINTURA		
NP-6.16	PINTURA ESMALTE PARA VENTANAS REJAS, PUERTAS REJAS, DOS CARAS Y DOS MANOS	M2	8,17
NP-6.18	PINTURA EPÓXICA DOS MANOS	M2	7,70
NP-10	INSTALACIONES ELECTRICAS		
NP-10.47	BALA PANEL LED 18W	UN	6,00
NP-12	URBANISMO, EXTERIORES Y OTROS		
NP-12.13	TRANSPORTE DE MATERIALES TRACCION ANIMAL EN ZONAS DE MUY DIFICIL ACCESO CON DISTANCIA HASTA 1 KM	KG/KM	6.364,00

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron.

QUIEN ENTREGA



Firma
WILLIAM CARDONA OLMOS
CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S
CONTRATISTA


Firma
DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY
ARQDILAM S.A.S
INTERVENTORIA

QUIEN RECIBE



Firma

Nombre: *DANIL ROBOYO BOTELLO*

C.C.:

I.E. TÉCNICA FRANCISCO JULIAN OLAYA –
SEDE EL DANUBIO

Firma

Nombre:

C.C.:

Cargo:

QUIEN RECIBE



Firma

ING. MARCELLA PATRICIA PEREZ MENDOZA
SUPERVISORA
FINDETER
