

Informe de Avance Ejecución
Julio de 2026

Gobernación del Tolima

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, REPOSICIÓN, Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y SILLAS DE ESCRITORIO PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS SIES.
CONTRATO:	3060 del 12 de mayo de 2026
VALOR:	96.384.110) IVA INCLUIDO
INICIO:	27 DE MAYO DE 2026
FIN:	29 DE JUNIO DE 2026
CLIENTE:	Gobernación del Tolima
ELABORA:	Jorge Iván Arroyave Z
INTERESADOS:	GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO RIOS SUPERVISOR


INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERIODO

Entre los días 25 y 26 de junio de 2026 se realizó la instalación de los dos sistemas de aire acondicionado Piso Techo BlueLine de 60.000 BTU para el centro de monitoreo de SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS SIES en la ciudad de Ibagué Tolima.

Ítem	Descripción	Seriales
1	Equipo Piso Techo BlueLine de 60.000 BTU	1BK2HWT100ZT12300019
2	Equipo Piso Techo BlueLine de 60.000 BTU	1BK2HWT100ZT12300016

La actividad incluyo la instalación de una acometida eléctrica independiente para cada uno de los sistemas de aire suministrados e instalados, así mismo, se realizó la instalación de la ductería o líneas de refrigerante entre el “Casete” y la “Unidad Condensadora”


Dentro del alcance del contrato estaba el desmonte de la unidad o el “Casete” del sistema anterior

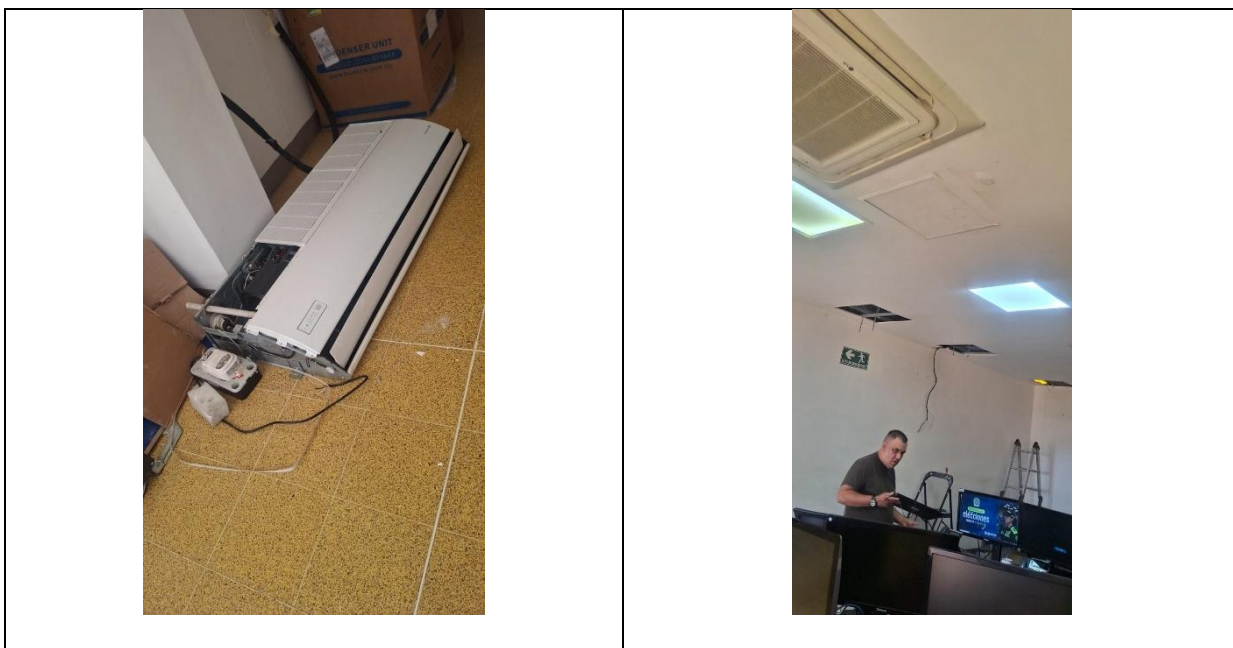

Nota: Se realizó el desmonte del “Cassette” que se encontraba instalado en el SIES de la Gobernación del Tolima para liberar el espacio donde se ubicaran los nuevos equipos.



Líneas de Refrigerante y Acometida Eléctrica para los nuevos Aires Acondicionados.

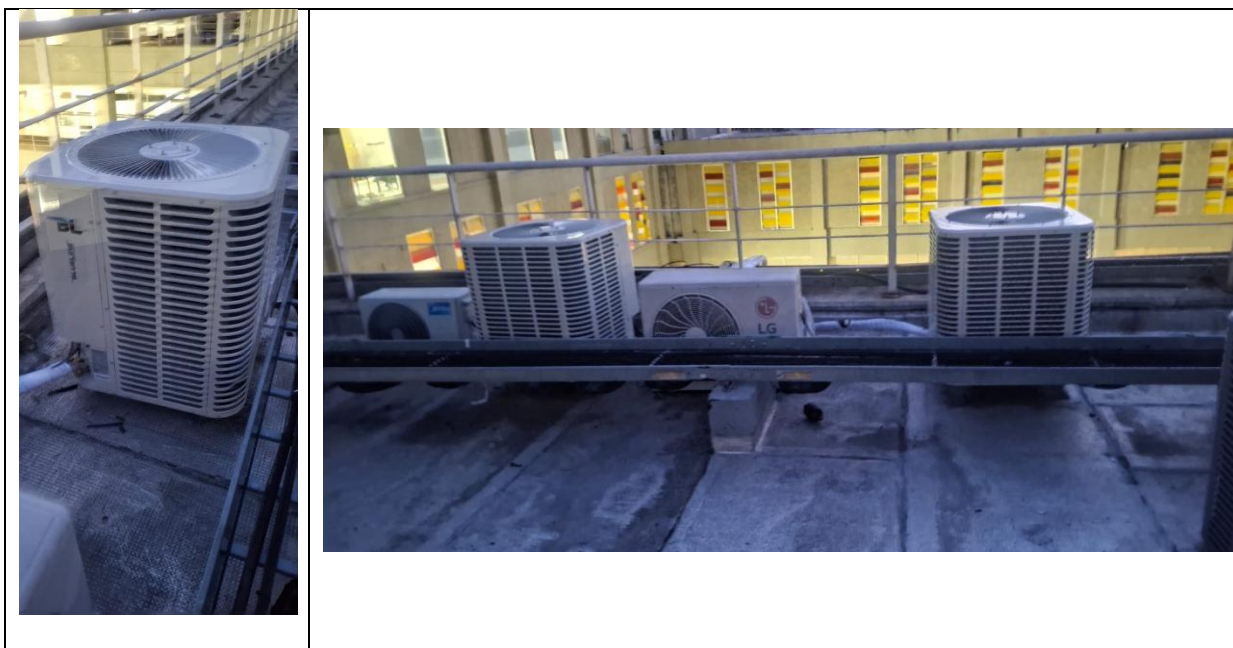

“Unidades Condensadoras” Suministrados e Instalados



“Unidades Condensadoras” Suministrados e Instalados (S/N 1BK2HWT100ZT12300016, 1BK2HWT100ZT12300019)



“Cassettes o Unidades Manejadoras” Suministrados e Instalados



“Cassettes o Unidades Manejadoras” Suministrados e Instalados

BLUELINE®			
EVAPORADOR UNIT ON/OFF INVERTER			
Model	PTE-6010C1	Capacity	Cooling
Rated Volt	208-230V~	Rated Current	28.6A
Rated Frequency	60Hz	Rated Power Input	6630W
Noise	53dB(A)	Max Current	40A
Weight	39.5 kg	Max Power Input	8000W
Max High Pressure	4.5MPa	Air Volume	2300m³/h
Max Low Pressure	1.2MPa		

PTE-6010C1 80
 251243716
 1BK27NT100ZT12200043

BLUELINE®			
EVAPORADOR UNIT ON/OFF INVERTER			
Model	PTE-6010C1	Capacity	Cooling
Rated Volt	208-230V~	Rated Current	28.6A
Rated Frequency	60Hz	Rated Power Input	6630W
Noise	53dB(A)	Max Current	40A
Weight	39.5 kg	Max Power Input	8000W
Max High Pressure	4.5MPa	Air Volume	2300m³/h
Max Low Pressure	1.2MPa		

PTE-6010C1 80
 251243716
 1BK27NT100ZT12200004


“Casetes o Unidades Manejadoras” Suministrados e Instaladas




Se realizan las respectivas pruebas de operación para verificar el correcto funcionamiento de los equipos suministrados.

Nota: Se hace la recomendación de realizar el cerramiento o el reemplazo de los vidrios del recinto del SIES que habían sido desmontados para mantener la temperatura del salón.

Se realiza la entrega de las 15 “Sillas para Escritorio” que se encuentran dentro del alcance del contrato.

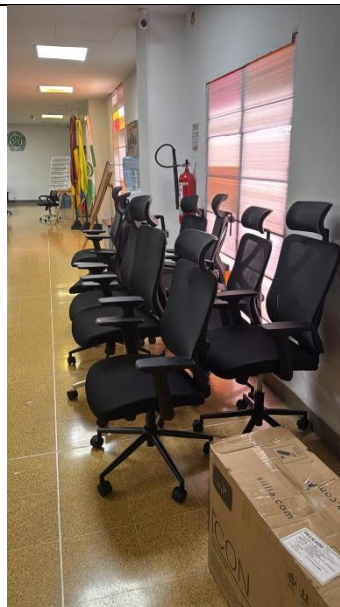

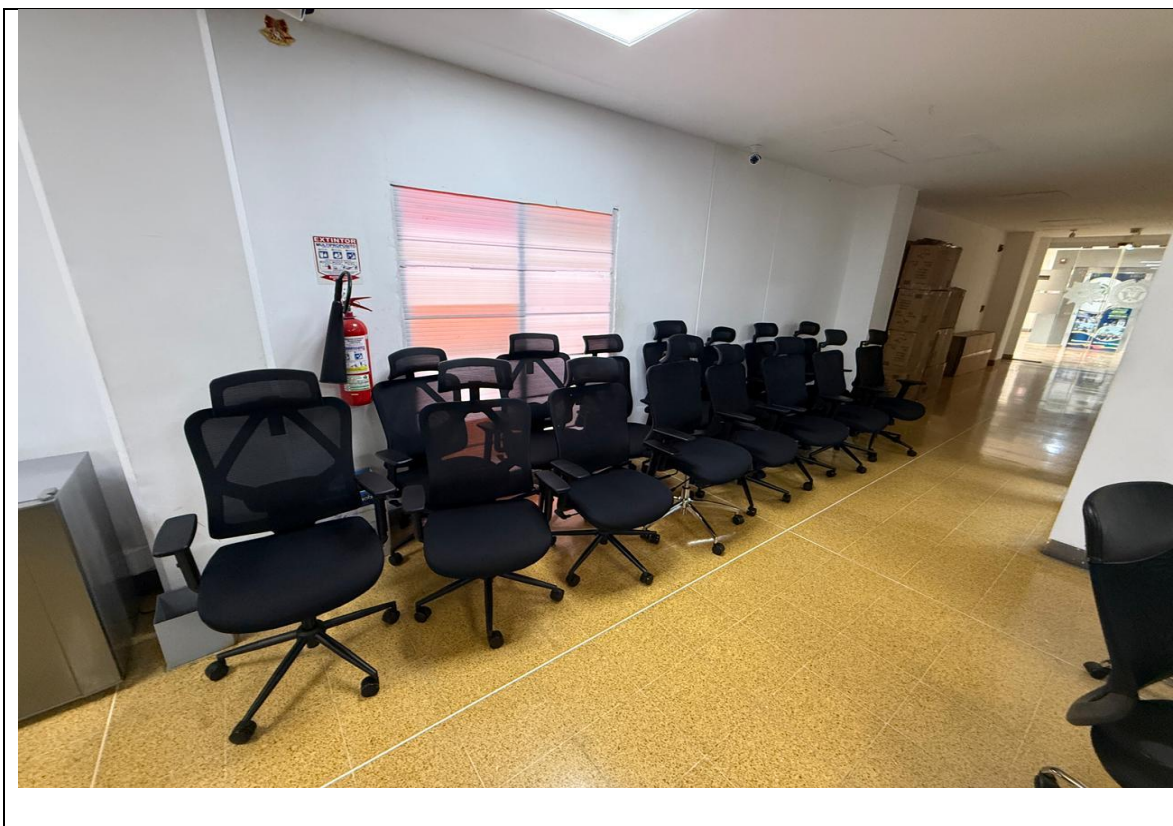

Se adjunta documento escaneado del acta de entrega con el VoBo del My Luis Gabriel Lopez Ayala, Comandante CAD (E), quien recibe los 02 Aires Acondicionado de 60.000 BTU y las 15 Sillas para Escritorio.

 VIOTEC CONECTANDO VIDAS	GESTIÓN OPERACIONES	FOR GO 012
	ACTA DE ENTREGA	VERSIÓN 001
		FECHA: NOVIEMBRE 2024

ACTA

Entrega X Capacitación Entrega Parcial Garantía Obra Civil
 Otras Cuál? _____

LUGAR Y FECHA:

En el Municipio de Ibagué, Tolima, a los 26 días del mes de Junio de 2026 , se suscribe la presente Acta de Entrega, correspondiente al proyecto "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, REPOSICIÓN, Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y SILLAS DE ESCRITORIO PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS SIES".

INTERVIENEN:

En la presente intervienen por parte de la gobernación del Tolima, _____, y por parte de VIOTEC SAS, **Jorge Iván Arroyave Z**, para dejar constancia a de la entrega y recibo a satisfacción de los equipos y elementos que hacen parte del contrato 3060 de 2026, "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, REPOSICIÓN, Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y SILLAS DE ESCRITORIO PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS SIES".

ASUNTO:

1. FUNDAMENTO LEGAL: CONTRATO No. 3060 de 2026

"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, REPOSICIÓN, Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y SILLAS DE ESCRITORIO PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS SIES".

 VIOTEC CONECTANDO VIDAS	GESTIÓN OPERACIONES	FOR GO 012
	ACTA DE ENTREGA	VERSIÓN 001
		FECHA: NOVIEMBRE 2024

2. MATERIAL RECIBIDO:

RELACIÓN DE EQUIPOS / ACTIVIDADES CONTRATO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	AIRE ACONDICIONADO 60.000 BTU	UND	2
2	SILLA PARA ESCRITORIO	UND	15

Nota: Los equipos suministrados dentro del alcance del contrato cumplen con todas las características solicitadas en el documento "Anexo 2. Condiciones Técnicas".

1. OBSERVACIONES:

2. AJUSTES REALIZADOS POR EL CLIENTE:

3. CIERRE:

La **Gobernación del Tolima**, manifiesta recibir a satisfacción los dos equipos suministrados dentro de la ejecución del contrato 3060, comprometiéndose a su adecuada custodia, operación y uso conforme a la finalidad del proyecto. Así mismo, se responsabiliza de la correcta administración y conservación de los equipos entregados.

 VIOTEC CONECTANDO VIDAS	GESTIÓN OPERACIONES	FOR GO 012
		VERSIÓN 001
		FECHA: NOVIEMBRE 2024
	ACTA DE ENTREGA	

VIOTEC SAS, certifica que los equipos entregados cumplen con las especificaciones técnicas establecidas para el contrato, se encuentran en correcto estado de funcionamiento al momento de la entrega, que realizará dos mantenimientos preventivos anuales durante el tiempo de la garantía (Aires Acondicionados), así mismo otorga la garantía por el término de Tres (3) años para todo el equipo. Tres (3) años en compresor.

4. TERMINOS DE GARANTIA:


A continuación se hace indican los términos de garantía referentes al producto o servicio a entregar.

La garantía **no** cubre:

- Sobrecargas eléctricas por descargas eléctricas como rayos o cortos por mala manipulación. Inmersión en el agua, golpes, caída libre o de altura, artillería pesada, detonaciones por minas a altura, munición de medio y bajo calibre. Manipulación indebida (fuera de lo indicado en los manuales)
- Daños por golpes, vandalismo o uso ajeno al especificado.
- Manipulación indebida por parte de terceros.
- Daños por manipulación por personal inexperto y que no haya sido previa y debidamente capacitado.
- Daños por cambios de componentes originales en el montaje y ensamblaje lo que implica la pérdida de la garantía.
- Modificación de las posiciones de los equipos instalados.
- Daños por eliminación o modificación del código de programación.
- Daños por uso del dispositivo sin alguna de sus partes o alteración de sus conexiones.
- Daños por negligencia de los usuarios.
- Accidentes, vandalismo, incendios, líquidos, productos químicos, otras sustancias, inundaciones, vibraciones, calor excesivo, ventilación inadecuada, sobrecargas eléctricas, descargas electrostáticas incluyendo rayos, otras fuerzas externas e impactos.
- Esta garantía no cubre los gastos de transporte ni los riesgos derivados del transporte de su producto.

 VIOTEC CONECTANDO VIDAS	GESTIÓN OPERACIONES	FOR G0 012
	ACTA DE ENTREGA	VERSIÓN 001
		FECHA: NOVIEMBRE 2024

ENTREGA


 Nombre: **Jorge Iván Arroyave Z**
 Cargo: Gerente de Proyectos
 Entidad: VIOTEC SAS


VoBo


 Nombre:
 Cargo: COMANDANTE CODO (E)
 Entidad: SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS SIES

RECIBE

GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO RIOS,
 DIRECTOR SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO
 SECRETARIA DE CONVIVENCIA CIUDADANA, SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO
 SUPERVISOR.
 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Atentamente,


 Jorge Iván Arroyave Z
 Gerente de Proyectos
 Viotec SAS
