





FECHA:

Ibaqué, 02 de octubre de 2018

PARA:

CLAUDIA PAOLA MUÑOZ BARRETO

DIRECTOR TÉCNICO

DE:

ABEL OTALORA ARIAS

SUPERVISOR

Ref.: Informe avance proyecto "AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y/O FORMULACIÓN DE PLANES MAESTROS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". Contrato No 121 del 12 de diciembre del 2013

Respetada Ingeniera;

La Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima – EDAT S.A. E.S.P. Oficial, Gestor del *Programa Agua para La Prosperidad PAP-PDA Tolima,* le informa que, de acuerdo con la referencia, el proyecto denominado "Mejoramiento del sistema de acueducto según Plan Maestro de Acueducto para los municipios de Suarez, Icononzo, Anzoátegui, Falan, Ataco, Valle de san juan, del Dpto. del Tolima" se encuentra en ejecución ya que este hace parte integral del Contrato referenciado y además con el fin de realizar el informe de gestión y el respectivo cargue al EJECUTOR. Estos proyectos tienen la siguiente trazabilidad:

AQUADATOS

HISTORIAL Y ANTECEDENTES CONTRACTUALES

CONTRATO No.	121 del 12 de diciembre de 2013					
CONTRATANTE	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO					
	Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL					
CONTRATISTA	AQUADATOS S.A.S					
NIT.:	830.062.201-0					
SUPERVISOR	ABEL OTALORA ARIAS					
CLASE	Consultoría					
OBJETO	"AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y/O FORMULACIÓN DE PLANES MAESTROS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL					

SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la republica Piso 8. Teléfonos: (578) 261 1327 Móvil: 320 341 18 64 E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co







INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIAS TOLIMA.
	Johanna González

BALANCE DEL CONTRATO SEGÚN FIA página web

VALOR CONTRATO	\$1.331.745.540	
VALOR ANTICIPO		
ADICIONAL 1	\$ 249.502.768	
VALOR ACTA PARCIAL No.1		\$ 206.212.524
VALOR ACTA PARCIAL No.2		\$ 234.410.327
VALOR ACTA PARCIAL No.3		\$ 235.729.736
VALOR ACTA PARCIAL No.4		\$ 101.988.029
VALOR ACTA PARCIAL No.5		\$ 277.723.409
VALOR ACTA PARCIAL No.6		\$ 59.541.811
VALOR ACTA PARCIAL No.7		\$ 27.192.445
VALOR ACTA PARCIAL No.8		\$ 119.570.499
ADICIONAL 2	\$ 89.964.625	
ADICIONAL 3	\$ 226.293.826	***************************************
SALDO CONTRATO		\$ 635.137.979
SUMAS IGUALES	\$ 1.897.506.759	\$1.897.506.759

SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN





GESTOR PAP-PDA TOLIMA



	TOLIMA".
DIRECCION Y TELEFONO	Av. 19 No 118-95 Ofic. 209
·	Tel. (091) 6208805 - 6208806 - 6208721 Bogotá
VALOR INICIAL	\$ 1.331.745.540 incluido IVA
ADICIÓN No 1	\$ 249.502.768 incluido IVA
VALOR FINAL	\$ 1.581.248.308 incluido IVA
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INCIO DEL CONTRATO
OTROSI MODIFICATORIO No 1 de 8 de abril de 2015	PRORROGAR TRES (3) MESES
OTROSI MODIFICATORIO No 2 de 05 de junio de 2015	ADICION \$ 249.502.768 incluido IVA
OTROSI MODIFICATORIO No 3 de 05 de junio de 2015	PRORROGAR DOS PUNTO CINCO (2.5) MESES
ACTA DE PRORROGA de 11 de septiembre de 2015	DOS (2) MESES
ACTA DE INICIACIÓN	30 de mayo de 2014
ACTA DE SUSPENSIÓN No 1	7 de noviembre de 2014
ACTA DE REINICIO No 1	19 de marzo de 2015
ACTA DE SUSPENSIÓN 2	10 de noviembre de 2015
ACTA DE REINICIO No 2	11 de octubre de 2016
ACTA DE ADICION No 4 del 11 de octubre de 2016	TRES (3) MESES Y \$ 89.964.625 incluido IVA
ACTA DE PRORROGA No 5 del 12 de enero de 2017	TRES (3) MESES
ACTA DE ADICION No 6 del 07 de abril de 2017	, ,
ACTA DE PRORROGA No 6 del 12 de julio de 2017	TRES (3) MESES
ACTA DE PRORROGA No 7 del 12 de octubre de 2017	TRES (3) MESES
ACTA DE PRORROGA No 8 del 27 de diciembre de 2017	TRES CINCO (3.5) MESES
ACTA DE PRORROGA No 9 del 10 de abril de 2018	CUATRO (4) MESES
ACTA DE PRORROGA 10 del 10 de agosto de 2018	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	12 de diciembre de 2018

SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la republica Piso 8. Teléfonos: (578) 261 1327 Móvil: 320 341 18 64 E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co







Municipios que integran este contrato con sus respectivos productos a entregar por parte del consultor.

Municipio	Usuarios	Catastro de redes	Catastro de us uarlos	Diagnóstico	Dise Nos	Formulación y Estructuración	Plan de Gestión Operacional (PCD)	Total productos
ORTEGA	2173	1	1	1	1	1	1	6
PIEDRAS	660	0	1	0	0	0	0	1
ICONONZO	1112	1	1	1	1	1	1	6
NA TAGAIMA	3237	0	1	0	0	0	0	1
FALAN	591	1	1	1	1	1	1	6
HERVEO	876	1	1	1	1	1	1	6
ANZ OATEGU	628	1	1	1	1	1	1	6 .
ATA∞	1618	1	1	1	1	1	1	6
SANLUIS	1280	1	1	1	1	1	1	6
SUAREZ	573	1	1	1	1	1	1	6
VALLEDE SANJUAN	726	0	0	1	1	1	1	4
Total	13474	8	10	0 /	9	. 0	k & 9 p = 5	64

El valor final de los productos, y por ende del contrato, serán el resultante de multiplicar las cantidades realmente ejecutadas por los valor unitarios definidos en la Tabla 7 para cada uno de los productos definidos en la Tabla 21; y en todo caso se deberán respetar los valores asignados a cada municipio de acuerdo con su respectivo CDR y el aporte destinado del CDR del departamento, de acuerdo con lo indicado en la tabla del balance del contrato.

A la fecha se encuentra esta consultoría en ejecución.

Garantías Contractuales

AMPARO	NUMERO	VALOR T	VIGENCIA [®]	COMPAÑÍA DE SEGUROS
Cumplimiento del contrato		\$ 167.121.293	2014-05-30 al 2018-09-05	
Buen manejo del anticipo		\$ 399.523.662	2014-05-30 al 2018-09-05	Liberty Seguros
Calidad del servicio	2290517	\$ 167.121.293	2014-05-30 al 2018-09-05	S.A.
Salarios y prestaciones sociales		\$ 167.121.293	2014-05-30 al 2021-05-09	-

SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la republica Piso 8. Teléfonos: (578) 261 1327 Móvil: 320 341 18 64 E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co







Programación de entrega de los productos por AQUADATOS.

✓ La interventoría, ni la consultoría AQUADATOS han realizado la entrega definitiva del proyecto de estudios y diseños para la optimización del acueducto de Suarez.

Balance contrato 121 de 2013.

MUNICIPIO ,	VALO	R CONTRACTUAL INICIAL	VALOR CANTIDADES MAS	C	VALOR ANTIDADES MENOS	VALORES ADICIONADOS	ADICIONA	ADO
ORTEGA	\$	265,191,077	\$ 93,959,060	\$		\$ 68,963,406	\$ 24,995,6	
PIEDRAS	\$	45,481,056	\$ 	-\$	39,168,816	\$ -	\$	
ICONONZO	\$	168,241,018	\$ 8,798,708	\$	-	\$ 6,458,013	\$ 2,340,6	595
NATAGAIMA	\$	46,481,600	\$ -	-\$	15,522,932	\$ -	\$	
FALAN.	\$	136,730,499	\$ -	-\$	35,272,878	\$ -	\$	
HERVEO	\$	89,419,707	\$ 27,736,047	\$	-	\$ 20,357,509	\$ 7,378,5	538
ANZOATEGUI	\$	91,630,374	\$ 9,081,615	\$		\$ 6,665,660	\$ 2,415,9	9 55
ATACO	\$	194,509,982	\$ 63,698,620	\$		\$ 46,753,063	\$ 16,945,9	557
SAN LUIS	\$	94,070,026	\$ 122,574,334	\$		\$ 89,966,244	\$ 32,608,0	090
SUÁREZ	\$	95,350,065	\$ 12,330,083	\$	-	\$ 9,049,947	\$ 3,280,1	136
VALLE DE SAN JUAN	\$	104,640,136	\$ 1,288,926	\$	-	\$ 1,288,926	\$	
TOTAL	\$	1,331,745,540	\$ 339,467,393	-\$	89,964,626	\$ 249,502,768	\$ 89,964,	625

AVANCE DEL CONTRATO:

Técnico: 66% Financiero: 60.2% Tiempo: 95.3

INFORME DE AVANCE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS para la entrega de los productos por AQUADATOS. En la Gestión Predial y Diseños

SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la republica Piso 8. Teléfonos: (578) 261 1327 Móvil: 320 341 18 64 E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co Ibagué – Tolima







> RESOLUCIÓN 1063 DE 2016

En lo que respecta a documentación a cargo de los municipios se requieren algunos documentos adicionales, para lo cual se realizó visita de seguimiento en donde el municipio nos entregó alguna documentación quedando pendiente documentación por diligenciar por las Empresas de servicio públicos del municipio de Suarez Tolima (aseguramiento de la prestación del servicio, diagnóstico de la ESP, fortalecimiento institucional y pago de subsidios,).

MUNICIPIO DE FALAN

➢ El proyecto en su entrega final fue radicado el 21 de agosto del 2018 a la EDAT S.A E.S.P. La respectiva entrega se realizó en sus requisitos documentales, técnicos y financieros a cargo de la consultoría faltando la documentación a cargo del municipio y de la Oficina de servicios públicos

> GESTIÓN PREDIAL:

De acuerdo con los comités realizados en el presente periodo, se actualiza la tabla de seguimiento al componente de gestión predial del municipio correspondiente.

MUNICIPIO	SERVIDUMBRE	COMPRA	PERMISOS	OBSERVACIONES
Falan	Esta para su respectiva legalización.	Está en trámite la compra de área para PTAP.		Está pendiente entregar la información completa del municipio y las empresas de servicios públicos según resolución 1063 de 2016 del MVCT a la consultoría AQUADATOS para su respectiva presentación al MVCT.







MUNICIPIO DE SUAREZ

- > El proyecto fue radicado el 5 de enero del 2018 a la Doctora Olga Lucia Alfonso Lanini Secretaria de Planeación y Tics de la Gobernación del Tolima.
- > Se recibió oficio No 1506 del 24 de agosto de 2018 por la EDAT S.A E.S.P. Asunto: Entrega lista de chequeo.
- Mediante oficio No 1037 y 1038 de agosto 30 de 2018 el supervisor de la EDAT S. A E.S.P remitió la lista de chequeo a la Interventoría y Consultoría AQUADATOS S.A
- Se esta a la espera de respuesta alguna por la Interventoría y consultoría AQUADATOS, respecto a la lista de chequeo del proyecto de Suárez. y su respectiva entrega final

> GESTIÓN PREDIAL:

De acuerdo con los comités realizados en el presente periodo, se actualiza la tabla de seguimiento al componente de gestión predial del municipio correspondiente.

MUNICIPIO	SERVIDUMBRE	COMPRA	PERMISOS	OBSERVACIONES
Suarez	Se Legalizaron cinco (5) resoluciones, está por aclarar una (1) resolución y cuatro (4) resoluciones más se presentaron para su legalización. El secretario de planeación revisara la gestión predial del diseño para la optimización del acueducto del municipio de Suarez Tolima.	PTAP. Se levantó el juicio de sucesión		Esta pendiente entregar la información completa del municipio y las empresas de servicios públicos según resolución 1063 de 2016 del MVCT a la consultoría AQUADATOS para su respectiva presentación al MVCT.







> RESOLUCIÓN 1063 DE 2016

En lo que respecta a documentación a cargo del municipio de Falan. Este realizó la entrega de documentos adicionales, para lo cual se realizó visita de seguimiento en donde el municipio nos entregó la documentación quedando pendiente documentación por diligenciar del diagnóstico de las Empresas de servicio públicos del municipio de Falan Tolima entregando la oficina de servicios públicos del municipio de Falan los formatos diligenciados correspondientes a su competencia. (aseguramiento de la prestación del servicio, diagnóstico de la ESP, fortalecimiento institucional y pago de subsidios,).

MUNICIPIO DE ANZOATEGUI

➢ El proyecto en su entrega final fue radicado el 21 de agosto del 2018 a la EDAT S.A E.S.P. La respectiva entrega se realizó en sus requisitos documentales, técnicos y financieros a cargo de la consultoría faltando la documentación a cargo del municipio y de la Oficina de servicios públicos

> GESTIÓN PREDIAL:

De acuerdo con los comités realizados en el presente periodo, se actualiza la tabla de seguimiento al componente de gestión predial del municipio correspondiente.

MUNICIPIO	SERVIDUMBRE	COMPRA	PERMISOS	OBSERVACIONES
Anzoátegui	Esta para su respectiva legalización. El topógrafo del mujcipio entregara perfil de la revisión topografica de los estudios y diseños para la optimización dela cueducto	Inara PIAP		Está pendiente entregar la información completa del municipio y las empresas de servicios públicos según resolución 1063 de 2016 del MVCT a la consultoría AQUADATOS para su respectiva presentación al MVCT.

SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN







> RESOLUCIÓN 1063 DE 2016

En lo que respecta a documentación a cargo del municipio de Anzoátegui. Este recibió los formatos para ser diligenciados y entregados de los documentos adicionales, para lo cual se realizó visita de seguimiento en donde el municipio nos atendió e informo que entregara el 17 de septiembre la gestión predial y las certificaciones correspondiente para el proyecto. Como también se le entrego al Gerente de la oficina de servicios públicos del municipio de Anzoátegui los formatos para diligenciar correspondientes a su competencia. (aseguramiento de la prestación del servicio, diagnóstico de la ESP, fortalecimiento institucional y pago de subsidios,).

MUNICIPIO DE ATACO

➢ El proyecto en su entrega final fue radicado el 17 de septiembre del 2018 a la EDAT S.A E.S.P. La respectiva entrega se realizó en sus requisitos documentales, técnicos y financieros a cargo de la consultoría faltando la documentación a cargo del municipio y de la Oficina de servicios públicos, el 1 de octubre de 2018 complementan la entrega de los documentos pendientes (Carta de presentación y ficha resumen).

> GESTIÓN PREDIAL:

De acuerdo con los comités realizados en el presente periodo, se actualiza la tabla de seguimiento al componente de gestión predial del municipio correspondiente.

MUNICIPIO	SERVIDUMBRE	COMPRA	- PERMISOS	OBSERVACIONES
Ataco	Esta para su respectiva legalización. El topógrafo de la Edat en compañía del contratista supervisor revisaran los puntos GeoReferenciados y el área del encerramiento de la PTAP el día 4 de octubre de 2018	Está en trámite la legalización del área para PTAP.		Está pendiente entregar la información completa del municipio y las empresas de servicios públicos según resolución 1063 de 2016 del MVCT a la consultoría AQUADATOS para su respectiva presentación al MVCT.

SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN







> GESTIÓN PREDIAL:

De acuerdo con los comités realizados en el presente periodo, se actualiza la tabla de seguimiento al componente de gestión predial del municipio correspondiente.

MUNICIPIO	SERVIDUMBRE	COMPRA	PERMISOS	OBSERVACIONES
Icononzo	Esta para su respectiva legalización. El topógrafo de la Edat en compañía del contratista supervisor revisaran los puntos GeoReferenciados y el área del encerramiento de la PTAP el día que programe la dirección técnica de la Edat S.A E.S.P	•		Está pendiente entregar la información completa del municipio y las empresas de servicios públicos según resolución 1063 de 2016 del MVCT a la consultoría AQUADATOS para su respectiva presentación al MVCT.

> RESOLUCIÓN 1063 DE 2016

En lo que respecta a documentación a cargo del municipio de Icononzo. Este recibirá nuevamente los formatos para ser diligenciados y entregados de los documentos adicionales, para lo cual se realizará visita de seguimiento; para verificar la gestión predial y las certificaciones correspondiente para el proyecto. Como también se le entregara al Gerente de la oficina de servicios públicos del municipio de Icononzo los formatos para diligenciar correspondientes a su competencia. (aseguramiento de la prestación del servicio, diagnóstico de la ESP, fortalecimiento institucional y pago de subsidios,).

MUNICIPIO DE ORTEGA

✓ El proyecto en su entrega final NO se ha radicado.

SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la republica Piso 8. Teléfonos: (578) 261 1327 Móvil: 320 341 18 64 E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co







RESOLUCIÓN 1063 DE 2016

En lo que respecta a documentación a cargo del municipio de Ataco. Este recibirá nuevamente los formatos para ser diligenciados y entregados de los documentos adicionales, para lo cual se realizará visita de seguimiento; para verificar la gestión predial y las certificaciones correspondiente para el proyecto. Como también se le entregara al Gerente de la oficina de servicios públicos del municipio de Ataco los formatos para diligenciar correspondientes a su competencia. (aseguramiento de la prestación del servicio, diagnóstico de la ESP, fortalecimiento institucional y pago de subsidios,).

MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JUAN

Aunque el proyecto de este municipio ya se presentó ante el MVCT para viabiliación como se explicó al inicio del acta del 21 de agosto de 2018, se citó a representantes del municipio para requerir la aclaración de coordenadas y localización de las áreas de compra de los predios de PTAP y desarenador y la entrega de los 4 certificados de tradición y libertad pendientes a los cuales se les impuso servidumbre. Este proceso no se ha realizado por la Alcaldía de Valle de San Juan.

Este proyecto ya tiene el concepto técnicamente aceptable recomendado mediante Comité técnico de proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, durante sesión No 37 del 2 de agosto de 2018.

Se realizó el 1 de octubre de 2018 entrega de una copia física por parte de la consultoría a la EDAT del proyecto que se radicó de este municipio ante el MVCT. Faltando documentación adicional entregada con posterioridad al MVCT, la cual debe ser requerida por la EDAT S.A E.S. P al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

MUNICIPIO DE ICONONZO

➢ El proyecto en su entrega final fue radicado el 1 de octubre del 2018 a la EDAT S.A E.S.P. La respectiva entrega se realizó en sus requisitos documentales, técnicos y financieros a cargo de la consultoría faltando la documentación a cargo del municipio y de la Oficina de servicios públicos.







MUNICIPIO DE HERVEO

✓ El proyecto en su entrega final NO se ha radicado.

MUNICIPIO DE SAN LUIS

✓ El proyecto en su entrega final NO se ha radicado

Cordial Saludo,

ABEI OTALORA ARIAS Supervisor EDAT SA E.S.P

- ✓ Anexo acta de reunión del 26 de septiembre de 2018 (Folios 6)
- ✓ Anexo acta de reunión del 20 de septiembre de 2018 (Folios 5)
- ✓ Anexo acta de reunión del 12 de septiembre de 2018 (Folios 11)
- Anexo oficio del 1 de octubre de 2018. TEC-105-14-352. Asunto: entrega de información pendiente Municipio de Ataco – Tolima. (Folio 1)
- ✓ Anexo oficio del 1 de octubre de 2018. TEC-105-14-351. Asunto: entrega Final de copia estudios y diseños radicados ante ventanilla del MVCT, proyecto optimización sistema de acueducto del municipio de Valle de San Juan. (Tolima). (Folio 1)
- ✓ Anexo oficio del 1 de octubre de 2018. TEC-105-14-350. Asunto: entrega Final de estudios y diseños para radicación ante ventanilla del MVCT, proyecto optimización sistema de acueducto del municipio de Icononzo. (Tolima). (Folio 2)

Reviso: Dirección Técnica. (02/10/2018) Proyecto: ABEL. OTALORA ARIAS Archivo: C\Documentos\Archivo GD-FO-02 VERSION: 00





AQUADATOS S.A.S NIT: 830.062.201-0 aquadatos@aquadatos.com Av. 19 # 118 - 95 of 209 Tel: (57) (1) 6208805 - 620 8806 Fax: (57) (1) 6208721 Bogotá, Colombia





Bogotá D.C, 01 de octubre de 2018

TEC-105-14-352

Señores
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA - EDAT SA ESP OFICIAL
Atn. Ing. Abel Otálora
Calle 11 No. 3-32 Piso 8, edificio Banco de la República
Ibagué (Tolima)

REF .:

Contrato No. 121 - AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y/O FORMULACIÓN DE PLANES MAESTROS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

ASUNTO:

Entrega de información pendiente del Municipio de Ataco Tolima.

Cordial saludo,

De acuerdo con lo establecido en la reunión realizada el día 17 de septiembre con el fin de consolidar la entrega final correspondiente al Municipio de Ataco Tolima por medio del oficio TEC-105-14-349, se hace entrega de los documentos pendientes (Carta de presentación y ficha resumen).

Agradecemos su atención.

Cordialmente,

MARLIN ELIANA LÓPEZ MEJIA Auxiliar de proyectos AQUADATOS S.A.S.

CC. Ing. Headdy Johanna Gonzalez Rodriguez- Consorcio Interventorias Tolima

PCCTOI : 1/10/2017

Página 1 de 1





AQUADATOS S.A.S NIT: 830.062.201-0 aquadatos@aquadatos.com Av. 19 # 118 - 95 of 209 Tel: (57) (1) 6208805 - 620 8806 Fax: (57) (1) 6208721

Bogotá, Colombia





Bogotá, 28 de septiembre de 2018

1-10-2018 10 00 10:37 1 1 1 1 MM Pay

TEC-105-14-351

Señores

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA - EDAT SA ESP OFICIAL Atn. Jhon Jairo Sánchez

Calle 11 No. 3-32 Piso 8, edificio Banco de la República Ibagué (Tolima)

REF.:

Contrato No. 121 - AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y/O FORMULACIÓN DE PLANES MAESTROS Y DISENOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LOS

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

ASUNTO:

Entrega final de copia estudios y diseños radicados ante ventanilla del MVCT, proyecto

optimización sistema de acueducto del municipio de Valle de San Juan (Tolima)

Cordial saludo,

De acuerdo con las obligaciones contractuales del contrato de la referencia, una de las actividades que debe desarrollar la consultoría es la viabilización de los proyectos ante el MVCT, para lo cual se requiere dar cumplimiento a los requisitos documentales, técnicos y financieros a cargo de la consultoría, pero también a requisitos legales, institucionales, ambientales y prediales a cargo de la entidad y los

Conforme a la solicitud realizada por el supervisor del contrato se hace entrega de una copia en medio físico y digital del proyecto radicado ante el MVCT. Este proyecto tiene concepto técnico favorable como lo indica el oficio 2018EE0061740 emitido por el MVCT. Es importante anotar que la copia mencionada tiene en algunos requisitos legales, institucionales, ambientales y/o prediales, información que fue entregada directamente por la EDAT (Ing. Willer Andres Rodnguez) al MVCT y que esta consultoría no

Atentamente.

GERMÁN E. GONZALEZ LEAL

Representante Legal AQUADATOS S.A.S.

ANEXO: Índice y documentación relacionada en el mismo en medio físico y digital.

Concepto técnico favorable emitido por el MVCT 26 folios

ing. Abel Otálora Supervisor del contrato de la referencia EDAT SA ESP OFICIAL (copia en medio digital) ing. Headdy Johanna Gonzalez Rodriguez- Consorcio Interventorías Tolima (copia en medio digital) CC.





AQUADATOS S.A.S NIT: 830.062.201-0 aquadatos@aquadatos.com Av. 19 # 118 - 95 of 209 Tel: (57) (1) 6208805 - 620 8806 Fax: (57) (1) 6208721 Bogotá, Colombia





SC 1445-1

Bogotá, 28 de septiembre de 2018

TEC-105-14-350

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA - EDAT SA ESP OFICIAL

Atn. Jhon Jairo Sánchez

Gerente

Calle 11 No. 3-32 Piso 8, edificio Banco de la República Ibagué (Tolima)

REF.:

Contrato No. 121 - AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y/O FORMULACIÓN DE PLANES MAESTROS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LOS

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

ASUNTO:

Entrega final de estudios y diseños para radicación ante ventanilla MVCT, proyecto

optimización sistema de acueducto del municipio de Icononzo (Tolima)

Cordial saludo,

De acuerdo con las obligaciones contractuales del contrato de la referencia, una de las actividades que debe desarrollar la consultoría es la viabilización de los proyectos ante el MVCT, para lo cual se requiere dar cumplimiento a los requisitos documentales, técnicos y financieros a cargo de la consultoría, pero también a requisitos legales, institucionales, ambientales y prediales a cargo de la entidad y los

Teniendo en cuenta que pese a las gestiones, comités y apoyo técnico dado por la consultoría tanto a la entidad como al municipio durante el plazo de ejecución del contrato no ha sido posible obtener la documentación a cargo de estos, se hace la respectiva entrega de los requisitos documentales, técnicos y financieros a cargo de la consultoría de acuerdo con el alcance del contrato de la referencia para el municipio del asunto; información que se encuentra debidamente organizada y foliada según los requerimientos definidos en la resolución 1063 de 2016 tanto en aspectos técnicos como de presentación.

Los documentos entregados se relacionan en el índice anexo, indicado el responsable de su elaboración y/o gestión, y en el caso que aplique la respectiva observación que debe ser atendida por la entidad o el municipio para dar cumplimiento al requisito de acuerdo con lo establecido por el MVCT.





AQUADATOS S.A.S NIT: 830.062.201-0 aquadatos@aquadatos.com Av. 19 # 118 - 95 of 209 Tel: (57) (1) 6208805 - 620 8806 Fax: (57) (1) 6208721 Bogotá, Colombia





SC 1445-1

Debe tener en cuenta la entidad, que algunos de los documentos deberán ser ajustados una vez esta o el municipio defina por ejemplo los requerimientos de financiación para el respectivo trámite de viabilización, sin embargo la consultoría entrega los archivos editables para que estos puedan ser ajustados por la entidad.

Adicionalmente, y al entregarse la información organizada de acuerdo con lo definido en la resolución 1063 de 2016, lo que debe tener en cuenta la entidad es que la documentación faltante a cargo de esta o del municipio se legaje en el respectivo apartado previsto para esta según el índice anexo.

Atentamente,

GERMÁN E. GONZALEZ LEAL

Representante Legal AQUADATOS S.A.S.

ANEXO: Índice y documentación relacionada en el mismo en medio físico y digital
cc. Ing. Abel Otáfora Supervisor del contrato de la referencia EDAT SA ESP OFICIAL (copia en medio digital) Ing. Headdy Johanna Gonzalez Rodriguez- Consorcio Interventorías Tolima (copia en medio digital)



AREA TECNICA

ACTA DE REUNION

Versión Código Página

00 PDA-FO1 DE 6

031



EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLO Y ASEO DEL TOLIMA- EDAT S.A. ESP OFICIAL, GESTOR DEL PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD - PAP PDA TOLIMA

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: 26 de septiembre de 2018

Nombre del Proyecto: AJUSTE, ACTUALIZACION Y/O FORMULACION DE PLANES MAESTROS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

PARTICIPANTES:

Luis Ángel Gómez Lizcano Abel Otálora Arias Diego Alexander Suarez Quimbayo Alcalde Municipio de Suarez Supervisor EDAT Secretario de Planeación

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Siendo las 8:30 P.M. del presente día, el supervisor de la EDAT saluda a los presentes y se procede en compañía de los participantes a realizar la reunión de visita a la alcaldía para conocer el avance del proyecto: AJUSTE, ACTUALIZACION Y/O FORMULACION DE PLANES MAESTROS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

- Expresa el supervisor que procede a diligenciar los formatos legales e institucionales necesarios para la presentación del proyecto al ministerio de vivienda ciudad y territorio
- 2. El Alcalde de Suarez expresa que para el Proyecto en mención se ha adelantado lo siguiente:

Con relación a la documentación faltante

 Documentación predial: se legalizaron cinco (5) Resoluciones, está por aclarar una (1) Resolución y cuatro (4) Resoluciones más, se presentaron para su

7

SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN
Calle 11 No. 3 – 32 Edificio Banco de la República Piso 8
Teléfonos: (0_8) 261 66 43 Móvil: 320 341 18 64
E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co
Ibagué – Tolima



AREA T	ECNICA

ACTA DE REUNION

00	PDA-FO- 031	2 DE 6
Versión	Código	Página



legalización. Se levantó el juicio de sucesión o división material para la legalización de la PTAP. Se realizó expropiación parcial del inmueble en donde va a quedar la PTAP y que es un predio de sucesión.

- Certificado de componente de Arqueología. No se ha entregado
- Permisos ambientales (permiso de ocupación de cauce y de Pasos elevados).
 Están esperando respuesta de Cortolima. Esperamos notificación de Jesús Guerra
- Certificado de acceso vial. No se ha entregado
- Formulario de diagnóstico ESP. No se ha entregado

Documentos entregados por el municipio	SI	NO
Certificado de cantera		x
Certificado de paz y salvo (Giros y Subsidios) REVISAR	Х	
Certificado de integración y funcionalidad	х	
Certificado ICANH		X
Acta de concertación con la Comunidad	X	
REQUISITOS LEGALES		
Certificado Aeronáutica civil		Х
Certificado de disponibilidad de servicios. APLICA PARA PLANTA NUEVA	X	
Certificado de ocupación Concesión vial – Férrea		X
Acta de sostenibilidad	х	<u> </u>
Acta de uso de suelo	X	
Concepto de localización de zona de no riesgo	X	
Certificado de inclusión en banco de proyectos	×	
Certificado de concordancia con el PND		Х
Certificado de inclusión en PDM	X	-
Certificado de inclusión en PDA	X	
Certificado de no financiación		Х
Certificado de precios de los materiales	X	
Certificado inclusión en EOT	X	

SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN

Calle 11 No. 3 – 32 Edificio Banco de la República Piso 8 Teléfonos: (0_8) 261 66 43 Móvil: 320 341 18 64

E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co Ibagué – Tolima 4



AREA TECNICA	Versión	Código	Página
ACTA DE REUNION	00	PDA-FO- 031	3 DE 6



Certificado de Aprobación y Viabiliación del proyecto del secretario de Planeación	Х	
Certificación de localización de predios y servidumbres		X
Formato diagnostico		Х
Esquema organizacional		Х

- Certificado de uso del suelo para predios donde se localicen las estructuras. Como no se ha legalizado no se ha entregado
- Certificado de proceso de aseguramiento de prestación del servicio según ley 142. No se ha entregado
- Paz y salvo por concepto de subsidios. Ya se entregó.
- Con relación a la Información de la Resolución 1063 de 2016 en donde se encuentran los formatos que deben ser diligenciados por el municipio con las certificaciones requeridas para presentar el proyecto. Si se entregaron. Faltando los modelos de las certificaciones que presente AQUADATOS en la entrega final.

Se hace entrega a la Gerente de la Empresa de servicios públicos del Municipio de Suarez en medio magnético (archivos Excel) los formatos correspondientes para el lleno de los requisitos y al Secretario de Planeación, obras públicas y desarrollo agropecuario del municipio de Suarez los archivos de las certificaciones en medio magnético para ser impresas y posteriormente firmadas del proyecto de la optimización del acueducto del Municipio de Suarez.

El supervisor de la EDAT entrega formatos tipo para que sean diligenciados por el Municipio de Suarez el día de hoy 26 de septiembre de 2018 y La Gerencia de la Empresa de servicios públicos del Municipio de Suárez enviara posteriormente los formatos diligenciados por correo electrónico

COMPROMISOS y/o CONCLUSIONES

- 1. El alcalde de Suarez entregara a la EDAT S.A E.S. P la legalización predial para el día 05 DE OCTUBRE DE 2018 del Estudio para la optimización del acueducto del Municipio de Suarez.
- 2. La Edat entregara al alcalde de Suarez formatos de certificaciones faltantes para el lleno de sus requisitos



AREA TECNICA		Código	Página
ACTA DE REUNION	00	PDA-FO- 031	4 DE 6



- 3. El Secretario de Planeación e infraestructura del Municipio de Suarez entregara informe de revisión predial del acueducto para el casco urbano del Municipio de Suarez. Como también verificara la existencia de viaductos a lo largo del diseño y revisara en lo posible las cotas de diseño del proyecto para el día 05 de octubre del 2018.
- 4. Con relación a la documentación faltante el Gerente de la Empresa de servicios públicos del Municipio de Suarez entregara posteriormente formatos tipo diligenciados por La Gerencia de la Empresa de servicios públicos del Municipio de Suarez, como también el Municipio realiza la entrega de certificaciones descritas anteriormente.
- Documentación predial: pendientes Certificados de Libertad y tradición de los permisos de servidumbre. Y la compra del bien de interés público de la PTAP.
- 6. Está en trámite esta documentación para ser entregados con posterioridad

4




AREA TECNICA Versión Código Página


ACTA DE REUNION 00 PDA-FO031 5 DE 6



REGISTRO FOTOGRAFICO

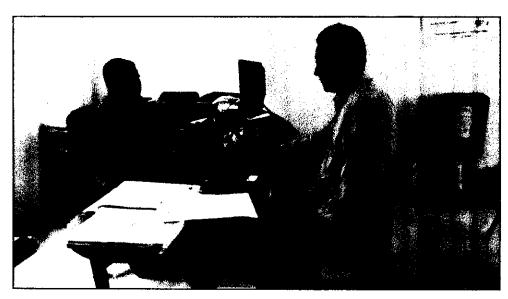

DILIGENCIANDO FORMATOS DE CERTIFICACIONES CON EL SECRETARIO DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SUAREZ PARA LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUARES TOLIMA

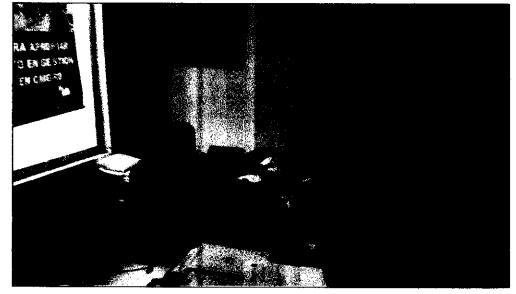

SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN


Calle 11 No. 3 – 32 Edificio Banco de la República Piso 8

Teléfonos: (0_8) 261 66 43 Móvil: 320 341 18 64

E-mail: gerenoa@edat.gov.co web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima

f




EDATIS.A ESP OFICIAL
SUPERVISOR
ASISTENTE
Sue plantación
Asistente
Sue plantación
Diegs Suell

Asistente

Asistente

PROYECTO: ABEL OTALORA ARIAS

Asistente



EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLO Y ASEO DEL TOLIMA- EDAT S.A. ESP OFICIAL, GESTOR DEL PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD - PAP PDA TOLIMA

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: 20 de septiembre de 2018

Nombre del Proyecto: AJUSTE, ACTUALIZACION Y/O FORMULACION DE PLANES MAESTROS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LOS

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

PARTICIPANTES:

Edwar Hernán Mendoza

Abel Otálora

Alex Camargo Soteio

Contratista Topógrafo EDAT

Supervisor EDAT

Gerente Empresa de Servicios públicos de Falan

S.A.S E.E.P.

Alberto Ballesteros Oliveros

Shirly González

Daniel Fernando Bustos

Contratista EDAT

Contratista EDAT Secretario De Planeación e Infraestructura Municipio

de Falan

Forney Munevar Monsalve

Alcalde Municipio de Falan

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Siendo las 9:30 am del día 20 de septiembre del 2018 se realizó visita por parte de funcionarios contratistas de la EDAT S. A E.S.P, con el fin de revisar en campo el proyecto de la optimización del acueducto del casco urbano del Municipio de Falan.

- 1. Se hace la revisión de los GPS localizados en la PTAP del acueducto del Municipio de Falan, los cuales posteriormente el topógrafo de la EDATS.A E.S.P entregara su respectivo informe topográfico.
- 2. Posteriormente se procedió a localizar el área de compra de la zona de la PTAP incluyendo el macro medidor, tanque elevado, tanque semisubterraneo, y las demás estructura hidráulicas localizadas en esta zona; encontrándonos en el replanteo con la situación de diseño compleja debido a que según Gerente de Aguas Falan ya se realizó acercamientos con el dueño de este terreno y verificando en campo lo

SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN

Calle 11 No. 3 – 32 Edificio Banco de la República Piso 8 Teléfonos: (0_8) 261 66 43 Móvil: 320 341 18 64 E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co



diseñado como encerramiento no cumple con las expectativas planteadas con el dueño. Por consiguiente, los funcionarios de la EDAT y el supervisor del contrato 121 de 2013 procedieron a definir los detalles de árboles y a localizar el macro medidor en un levantamiento planimetrico de la zona de la PTAP para así definir definitivamente el área real a comprar. Lo anterior debido a que comparado el replanteo con el diseño del cerramiento, el macro medidor se había dejado por fuera de la zona de cerramiento. Zona a efectuar la compra.

- 3. Se realizó trabajo de campo de identificación del predio general a comprar de la PTAP, su respectiva ampliación incluido el macro medidor y una estructura de desagüe de un tanque construido y el diseño de los lechos de secado
- 4. Según el supervisor de la EDAT: Se deben de precisar los diseños de área del predio apropiar que contiene la infraestructura a construir de la PTAP y lechos de secado ya que según las medidas y puntos topográficos identificados el día de hoy ocuparía un área de acceso de servidumbre a la PTAP.
- 5. Es necesario que quien está a cargo de los diseños especifique e identifique claramente los trazados para así poder determinar los respectivos permisos de servidumbre a constituir.
- 6. De acuerdo con lo definido en la resolución 1063 de 2016, se le reitera al Municipio de Falan actualizar información o incorporar la faltante al proyecto entregado a la EDAT S.A E.S. P que es de su competencia

MUNICIPIO DE FALAN:


Entrega:

Documentos entregados por el municipio	SI	NO
Certificado de cantera	X	+
Certificado de paz y salvo (Giros y Subsidios)	X	
Certificado de integración y funcionalidad	X	-
Certificado ICANH	X	-
Acta de concertación con la Comunidad	X	-
REQUISITOS LEGALES		+ -
Certificado Aeronáutica civi!	X	†
Certificado de disponibilidad de servicios	X	+
Certificado de ocupación Concesión vial – Férrea	X	+
Acta de sostenibilidad	X	-

SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN

Calle 11 No. 3 ~ 32 Edificio Banco de la República Piso 8 Teléfonos: (0_8) 261 66 43 Móvil: 320 341 18 64 E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co Ibagué – Tolima





Acta de uso de suelo	X
Concepto de localización de zona de no riesgo	X
Certificado de inclusión en banco de proyectos	Х
Certificado de concordancia con el PND	Х
Certificado de inclusión en PDM	x
Certificado de no financiación	x
Certificado de precios de los materiales	x
Certificado inclusión en EOT	х
Certificación de localización de predios y servidumbres	X
Formato diagnostico	X
Esquema organizacional	X

Se hace entrega al Gerente de la Empresa de servicios públicos del Municipio de Falan y al Secretario de Planeación e infraestructura del municipio de Falan el plano predial en medio magnético. Y todo el proyecto de la optimización del acueducto del Municipio de Falan medio magnético en la versión final.

El supervisor de la EDAT con la auxiliar de ingeniería Shirly González entrega formatos tipo para que sean diligenciados por el Municipio de Falan y La Gerencia de la Empresa de servicios públicos del Municipio de Falan

COMPROMISOS y/o CONCLUSIONES

- 1.- El Secretario de Planeación e infraestructura del Municipio de Falan entregara informe de revisión predial del acueducto para el casco urbano del Municipio de Falan. Como también verificara la existencia de viaductos a lo largo del diseño y revisara en lo posible las cotas de diseño del proyecto para el día 14 de octubre del 2018.
- 2,- Con relación a la documentación faltante el Gerente de la Empresa de servicios públicos del Municipio de Falan entrega hoy 20 de septiembre de 2018 formatos tipo diligenciados por La Gerencia de la Empresa de servicios públicos del Municipio de Falan, como también el Municipio realiza la entrega de certificaciones descritas anteriormente.
- 3.-Documentación predial: pendientes Certificados de Libertad y tradición de los permisos de servidumbre. Y la compra del bien de interés público de la PTAP. Está en trámite esta documentación para ser entregados con posterioridad

SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN

Calle 11 No. 3 – 32 Edificio Banco de la República Piso 8 Teléfonos: (0_8) 261 66 43 Móvil: 320 341 18 64 E-mail: <u>gerencia@edat.gov.co</u> web: <u>www.edat.gov.co</u> Ibagué – Tolima In V

REGISTRO DE ASISTENCIA FORMATO DE REGISTRO CÓDIGO: PDA-FO-069
VERSIÓN: 00
FECHA: Oct/14

Terman state of the many of th	REGISTRO	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: Oct/14 Página 1de 1	4
TEMA: "ESTUDIOS Y I	"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION DEL MUNICIPIO DE FALAN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"		SISTEMA DE ACUE	ACUEDUCTO DEL
FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018	E DE 2018	LUGAR:	FALAN	
FACILITADORES:		HORA:	9 AM	
NOMBRE	CARGO	CORREO ELECTRONICO	O TELEFONO	FIBMA
ALEX CAMMADEO SOTELO	6528070 BSP	GERBUR ESP ESEFOLOURE/LOMOSPICE	m 352368376	
Pannel Fernando Bushes	Sec. Plemoscion	Sample madeplanes and	32/4577492	and the second
Former HUMENON M.		fornexaumo Ogmail com	ma.gox co	Bhi. r
Abel Otalora Arias	Contratista - Superior abolistie yahoo	abolista@ yahour	3133902648	
Shiriy Goodfale?	Contration	Shirty - 4201@hot	+ alconyozzz Shirly 6	Shirte
Column H Mendoter 1	Contratistes	shorts, 24 dhed no	16 311557450 E	that Hopkins
Alberto SAllesteros 7	contratuk	contratist albortsboke while 513468989 fly	JE 213 815 W	Mary 506
		5		

REGISTRO FOTOGRAFICO




REPLANTEO ENCERRAMIENTO PTAP DEL MUNICIPIO DE FALAN DESDE EL MOJON GEOREFERENCIADO POR AQUADATOS



ZONA DE ACCESO A LA PTAP DEL MUNICIPIO DE FALAN



REPLANTEO ZONA PTAP



EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLO Y ASEO DEL TOLIMA- EDAT S.A. ESP OFICIAL, GESTOR DEL PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD - PAP PDA TOLIMA

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: 12 de septiembre de 2018

Nombre del Proyecto: AJUSTE, ACTUALIZACION Y/O FORMULACION DE PLANES MAESTROS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

PARTICIPANTES:

Edwar Hernán Mendoza Abel Otálora Jesús Alirio Guerra Alberto Ballesteros Oliveros Michael Estevel Ríos Chávez

Juan Carlos Bobadilla

Contratista Topógrafo EDAT Supervisor EDAT

Unión Temporal Gestión predial Tolima 2018

Contratista EDAT

Contratista Topógrafo Alcaldía de Anzoátegui Gerente Oficina de servicios públicos del Municipio

Anzoátegui

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Siendo las 8:30 am del día 12 de septiembre del 2018 se realizó visita por parte de funcionarios contratistas de la EDAT S. A E.S.P., con el fin de revisar en campo el proyecto de la optimización del acueducto del casco urbano del Municipio de Anzoátegui.

- 1. Se hace la revisión del GPS 3 Y GPS 4, los cuales posteriormente el topógrafo de la EDATS.A E.S.P entregara su respectivo informe topográfico.
- 2. Posteriormente se procedió a ubicar el MOJON 1, el cual no se encuentra instalado en campo y se deberá solicitar al consultor AQUADATOS S.A su respectiva instalación.
- 3. Seguidamente se procedió a constatar la localización tanto del tanque proyectado como de los lechos de secado encontrando que la ubicación del tanque proyectado según trabajo de campo realizado abarca en su totalidad la servidumbre de transito de acceso a la vivienda ubicada cerca al tanque actual construido del acueducto del municipio de Anzoátegui. Y los lechos de secado se encuentran diseñados según

SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN

Calle 11 No. 3 - 32 Edificio Banco de la República Piso 8 Teléfonos: (0_8) 261 66 43 Móvil: 320 341 18 64 E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co lbagué - Tolima





ACON Smile Tibb	01 30 S	-03-A09 150	00	ACTA DE REUNION	EL 20 SEEKINGON DET JOPHNY
Sugmentage.	enigė9	ogibòD	nòiers∖V	AREA TECNICA	वहन महित्रमञ्ज

trabajo de campo en la pata del talud cerca de una de las cajas de desagüe sin funcionar de la PTAP.

4. Se realizó trabajo de campo de identificación del predio general a comprar de la PTAP, su respectiva ampliación incluido los lechos de secado y el diseño del tanque proyectedo.

proyectado

5. Según el Doctor Jesús Guerra expresa: Se deben de precisar los diseños de área
del predio apropiar que contiene la infraestructura a construir de la PTAP ya que
según las medidas y puntos topográficos identificados el día de hoy ocuparía el área

de acceso de servidumbre a la vivienda contigua a la infraestructura.

6. Es necesario que quien está a cargo de los diseños especifique e identifique claramente los trazados para así poder determinar los respectivos permisos de servidumbre a constituir esto con relación a la NOTA del plano 2 de 3 que dice: "Se servidumbre a constituir esto con relación a la NOTA del plano 2 de 3 que dice: "Se recomienda al Municipio Legalizar el tramo existente entre los lechos de secado y la recomienda al Municipio Legalizar el tramo existente entre los lechos de secado y la


<u>quebrada el Fierro."</u>
 De acuerdo con lo definido en la resolución 1063 de 2016, se le reitera al Municipio de Anzoátegui actualizar información o incorporar la faltante ai proyecto entregado a la EDAT S.A E.S. P que es de su competencia

MUNICIPIO DE ANZOATEGUI:

OBSERVACIÓN	REQUISITOS			
	OCUMENTALES	 	REGU	1
Elaborado por AQUADATOS SAS y se entrega a la EDAT archivo editable.	eb sheO			
Pendiente incluir la firma del gerente y el número total de folios de acuerdo con la documentación que adjunte tanto la EDAT como el Municipio.	presentación	-	- 1.1	
Sujeta a cambios según fuentes de financiación.	Hologyupeaid			
Sujeta a cambios según fuentes de financiación.	Ficha MGA	-	- 5.1	
	REQUISITOS LEGALES			7
Este trámite no es competencia contractual de AQUADATOS SAS, sin embargo.				
la presente consultoria lo realizó ante el ICANH. El ICANH contesto que se			1	
requiere un "PROGRARA DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIV" debido a que el Municipio INVOLUCRA ACTIVIDADES QUE PUEDEN INVOLUCRA ACTIVIDADES				
PATRIMONIO PAQUEOLOGICO. Esta respuesta fue enviseda a la EDAT EL	ICANH	-	2.1	
ESP OFICIAL y al municipio por medio del oficio TEC-105-14-312.	LINDIO	1	10-	
No obstante, la secretaria de pianeación remitió a esta consultoria dos oficios en			1	
los que certifican que no hay afectación al patrimonio arqueológico ni cultural			1	
con el desarrollo de las obras.				┪
Este trámite no es competencia contractuel de AQUADATOS SAS, sin				
embargo, la presente consultoria a partir de la guia de la Actonáutica Civil "EL USO DE LOS SUELOS EN ÁREAS ALEDAÑAS A			-	
AEROPUERTOS" revisó la localización general de la Planta de			i	
eup -QAT9) sbszimitgo v ehrelzixe eldsb9 gupA eb otniemismT	Aeronáutica Civil	-	- 2.2	
corresponde a infraestructura con atractivo de tauna aviar) con				
respecto a la localización de aeropuertos indicados en la plancha IGAC		l 1		
226, y se determinó que NO hay afectación alguna. Por lo anterior se				
solicitó a la AERONAUTICA CIVIL confirmar lo anteriormente expuesto			1	T

4

SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN
Calle 11 No. 3 – 32 Edificio Banco de la República Piso 8
Teléfonos: (0_8) 261 66 43 Móvil: 320 341 18 64
E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co
Ibagué – Tolima




				₹
	-	1.2.5		
	 		-	1
Plan de gestión	-	-	3.5	
Prestador				1
le soibisdu?	-		3.4	
pago de	!!			ŀ
Fortalecimiento Institucional	-	_	£.£	
Públicos		,]
Servicios] [Ì
	-	*	3.2	
· _			1	Ì
ŧ				
ļ			·	1
	-	-	1.5	
CHUNALES	פווומ	NI		\vdash
		141		3
	1020		r	╁
			i	
_	{			
ì	- }	-	50	
	{		ĺ	
l "			İ	
instrumentos			<u> </u>	
qATq]			
acceso a la			2.4	ļ
Certificación de	l i		ĺ	l
	 		<u> </u>	
	1			1
_			1	
Franja	-	•	£.S	
_	-	•	2.3	
Franja	-	•	£.2	
Franja	-	•	£.2	
Franja	•		£.2	
Franja	•		£.S	•
Franja	-		5.2	
Franja	-		2.3	
Franja	-		2.3	
	acceso a la pTAP Instrumentos técnicos descricos orientadores de gestión destrono (Uso del Esquema organizacional Prestadores de Servicios Prestadores de Profilicos Diagnóstico de Servicios Prestadores de Prestadores de Servicios Prestadores de Servicios Prestadores de Prestadores de Prestadores de Servicios Prestadores de Prestadores de Servicios de Prestadores al Prestadores a	scceso a la pTAP Instrumentos técnicos de la fecnicos orientadores de la planificación y gestión del seritorio (Uso del suelo y riesgo) REQUISITOS STITUCIONALES FORMISTOS Empresas Organizacional Prestadores de Prestadores de la princios de la princios de la principal de la principal de la prestadores de la principal de la princ	scceso a la pTAP Instrumentos técnicos de la particación γ técnicos onentadores de la planificación γ gestión del gestión del suelo γ riesgo de la prestadores de Esquema Diagnóstico de Empresas Prestadores de Presta	2.4 PTAP Instrumentos PTAP Instrumentos defenicos orientadores de tecnicos orientadores de territorio (Uso del suelo y riesgo) REQUISITOS REQUISITOS SEQUISITOS INSTITUCIONALES Organizacional Prestadores de Prestadores de Prestadores de Servicios Servicios Diagnóstico Comato Prestadores de Prestadore 3.3 - Prestador Prestador Prestador Prestador Opéracional Opéracional

Pendiente incluir la firma del gerente y el número total de folios de acuerdo con la documentación	Formato resumen	-	-	1.4	
	REQUISITOS TÉCNICOS				7



SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN Calle 11 No. 3 – 32 Edificio Banco de la República Piso 8 Teléfonos: (0_8) 261 66 43 Móvil: 320 341 18 64 E-mail: <u>gerencia@edal.gov.co</u> web: <u>www.edal.gov.co</u> Ibagué – Tolima





-[Disponibilidad de servicio	-	-	4.24
El municipio deberá certificar que las fuentes de material pétreo son desarrollarán las obras proyectadas y que cuentan con los permisos requendos	Canteras o fuentes de materiales pétreos y escombreras	•	-	4.23
by COLADATOR Certifica las funcionalidad e infegralidad de las obras proyectadas. Sin embargo, se encuentra pendiente que el municipio certifique el estado dels infraestructura a cargo de GENIVAR Inc. Sucursal Colombia. El requerimiento se realizó el dis El requerimiento se realizó el dis SY/04/2018 a la gerencia de ESP sin respuesta alguna am respuesta alguna	Certificación de funcionalidad e integralidad	•		4.2
due adjunte tanto la EDAT como el Municipio. Sujeta a cambios según fuentes de financiación				

y nemmato resumen y Dentro del formato resumen dentro de la carta de presentación DAUAUAL 2.3 - 2.6 TAGA LOA LA		REQUISITOS FINANCIEROS			9
	nòisenteserq es estes et eb ortheb netq nu otsevorq SOTAGAUDA res edeb ogradme nis oreionanit	Plan financiero	-	- E.3	

	REQUISITOS PREDIALES				L
Pendiente aprobación y firma por parte del Municipio Entrega parte del manicipio Entrega formato editable	Certificación localización predios y servidumbres			1.7	
Se requiere 1 predio para PTAP, Lechos de secado y tanque de almacenamiento proyectado. Debe contar con certificado de libertad y tradición a nombre del município	Predios	-	-	S.T	
Certificaciones de libertad y tradición pendientes, aún no han tradición pendientes, aún no haciono con emitidas por el municipio, no obstante, el municipio indicó que se está realizando el trámite. Son 8 servidumbres	Servidumbres	-	-	€.7	
-	Autorizaciones de paso Soluciones individuales en agua y saneamiento	-	-	4.7 8.7	4
Plano Eleborado por AQUADADAS SAS y remitido en repetidas ocasiones a la EDAT y al municipio	Pianos prediales	-	-	9.Y	

magnético. Se hace entrega al Gerente de la Oficina de servicios públicos del Municipio de Anzoátegui y al topógrafo del municipio de Anzoátegui del plano predial en medio

Telefonos: (0_8) 261 66 43 Móvil: 320 341 18 64 E-mail: gere<u>ncia@edaLgov.co</u> web: <u>www.edat.gov.co</u> lbagué – Tolima Calle 11 No. 3 – 32 Edificio Banco de la República Piso 8 SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN



SmiloTieb	2 DE 10	-07-A09 150	00	ACTA DE REUNION	M 海流 dosembleción del Trolana ・
Sugar de la companya	enigèq	ogibòD	nòis≀aV	ASEA TECNICA	का मुद्रापवा 🕸

El supervisor de la EDAT entrega formatos tipo para que sean diligenciados por el Municipio de Anzoátegui y La Gerencia de la oficina de servicios públicos del Municipio de Anzoátegui

COMPROMISOS y/o CONCLUSIONES


1.- El topógrafo del Municipio de Anzoátegui entregara perfil longitudinal del acueducto para el casco urbano del Municipio de Anzoátegui con el fin de verificar la existencia de viaductos y revisar cotas de diseño del proyecto para el día 24 de septiembre del 2018. Como también perfil del tramo existente entre los lechos de secado y la quebrada el Fierro."

2,- Con relación a la documentación faltante el Gerente de la oficina de servicios públicos del Municipio de Anzoátegui se compromete a entregar para el día 17 de septiembre de 2018.

- Documentación predial: Certificados de Libertad y tradición, permisos de servidumbre.
- Certificado de componente de Arqueologia.
- Permisos ambientales.
- Certificado de acceso vial.
- Formulario de diagnóstico ESP.
- Certificado de uso del suelo para predios donde se localicen las estructuras.
- Certificado de proceso de aseguramiento de prestación del servicio según ley
- Paz y salvo por concepto de subsidios.
- Información de la Resolución 1063 de 2016 en donde se encuentran los formatos que deben ser diligenciados por el municipio con las certificaciones requeridas para presentar el proyecto.



SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN Calle 11 No. 3 – 32 Edificio Banco de la República Piso 8 Teléfonos: (0_8) 261 66 43 Móvil: 320 341 18 64 E-mail: <u>gerencia@edat.gov.co</u> web: <u>www.edat.gov.co</u> Ibagué – Tolima



REGISTRO FOTOGRAFICO



ACCESO TANQUE EXISTENTE DE ALMACENAMIENTO




LOCALIZACION TANQUE PROYECTADO



SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN Calle 11 No. 3 – 32 Edificio Banco de la República Piso 8 Teléfonos: (0_8) 261 66 43 Móvil: 320 341 18 64 E-mail: gerencia@edaLgov.co web: www.edat.gov.co Ibagué – Tolima







LOCALIZACION MOJON 1 DE REFERENCIA EL CUAL NO ESTA INSTALADO



ZONA LOCALIZACION TANQUE PROYECTADO

SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN

Calle 11 No. 3 – 32 Edificio Banco de la República Piso 8

Teléfonos: (0_8) 261 66 43 Móvil: 320 341 18 64

E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co lbagué – Tolima







AREA TECNICA

ACTA DE REUNION

Versión

00

Código

8 DE 10

PDA-FO-

031

Página





LOCALIZACION LECHOS DE SECADO





UBICACIÓN GPS 4

SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN Calle 11 No. 3 – 32 Edificio Banco de la República Piso 8
Teléfonos: (0_8) 261 66 43 Móvil: 320 341 18 64
E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co
Ibagué – Tolima







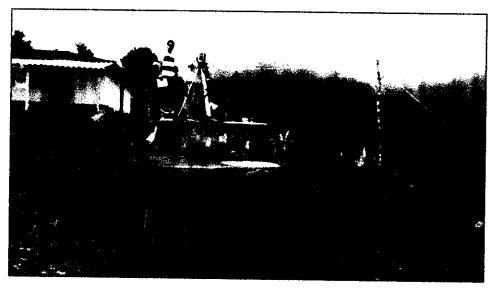


LOCALIZACION AUXILIAR TOPOGRAFICA PARA ENCONTRAR MOJON 1 (NO EXISTE) Y UBICACIÓN DEL TANQUE ACTUAL EXISTENTE



UBICACIÓN DEL TANQUE ACTUAL EXISTENTE

SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN Calle 11 No. 3 – 32 Edificio Banco de la República Piso 8 Teléfonos: (0_8) 261 66 43 Móvil: 320 341 18 64 E-mail: <u>gerencia@edat.gov.co</u> web: <u>www.edat.gov.co</u> Ibagué - Tolima







UBICACIÓN GPS 4

SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN

Calle 11 No. 3 – 32 Edificio Banco de la República Piso 8
Teléfonos: (0_8) 261 66 43 Móvil: 320 341 18 64
E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co
Ibagué – Tolima







The state of the s	Jill L.J.I.	REGISTRO DE ASISTENCIA	STENCIA	FECHA: Oct/14
<				Página 1de 1
	Proyecto			
TEMA:	のりかってきていっ	optimización Acutoucto Municipio De Antontogo	DE ANTON	regor.
FECHA:	12 de Sap /2018	12018	LUGAR:	Plantactor more topal Augustayon tourse.
FACILITADORES:	Abot otalora minu	₹.)P.	HORA:	8:30 - 3:30 PM

			Acost		Jun carlos Bubudilla B	Michael Estive Rios Clave & Alcaldia Anadego: Maicalvio225@gmail.com 3208796262	FAEL OTALONA ANTAL	Alberto Bellesteros +	NOMBRE
			Gerante Chion For	Gatatista GUAT	OFICIAL SONGS PT	Topografo Alcaldia Anzoatig	Supervisor Contrat	contradist esas	CARGO
			Gerante Chion Forpy Judien productions Quant	Contaitista Colods: 240htm: 1 con 3115594860 In	OFICING SENCES PHOFICING SENCES PURICIONAL	o: Marcalvio225@gmail.com	Supervisor Gontratista abolerore yution	contradist esses albastosbete aboth	CORREO ELECTRONICO
			@9-1/- 3013346980	3115594864	813161.01E	3208776262	44 hor as 3/3340 Ky	6 99696AE 15 44 04	TELEFONO
			Service of	The 4 holes	100	Maine mos	2	o Alhi	FIRMA
