

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 1 de 7
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN AL EJECUTOR TOLIMA

A. Información General

Dependencia responsable:	
Código de la meta:	P2S21MP12
Nombre de la meta:	300 Puntos lumínicos nuevos conectados a la red eléctrica en sector urbano y rural
Indicador de producto:	Número de puntos lumínicos instalados
Tipo de Indicador:	Acumulado
Meta del Cuatrienio:	300

B. Información Específica de la Meta

META PROGRAMADA VIGENCIA	META ALCANZADA *	AVANCE DE EJECUCIÓN PARA ESTE CARGUE **	TOTAL, EJECUTADO ACUMULADO PARA LA VIGENCIA
220	129	107	236

*: Corresponde al valor registrado en el ejecutor antes de este cargue de información.

Dependiendo del tipo de indicador, si es No acumulado, para el primer cargue de información es 0

**: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: La programación y avances de ejecución deben corresponder a lo ingresado en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

C. Definición de Tiempos de Reporte

Fecha del Reporte: (01/10/2026)

Periodo de Reporte: Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026.

D. Relación de Soportes y Evidencias

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRAFICO o VIDEOS	X
CONTRATO / CONVENIO	
ACTA	
INFORME	
OTRO ¿CUÁL? (Indicar)	Certificado Ejecución proyecto Flandes Certificado ejecución proyecto vía Chaparral Tuluni

Tipo de soporte: (Marcar con una X en las opciones que describan el tipo de soporte)

E. Registro de Población Beneficiada

BENEFICIADOS	CUANTOS
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	2

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 2 de 7
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

BENEFICIADOS	CUANTOS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	
ASOCIACIONES	
OTRO ¿CUÁL? (Indicar)	

Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

F. Identificación de Enfoque Diferencial y Territorial

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
TERRITORIAL	URBANO	80.539
	RURAL	
ÉTNICO	INDÍGENA	
	AFRO	
	RROM	
GÉNERO	HOMBRE	
	MUJER	
	OTRO	
CICLO VITAL	(0 – 5 AÑOS)	
	(6 – 11 AÑOS)	
	(12-17 AÑOS)	
	(18 A 28 AÑOS)	
	(29 A 59 AÑOS)	
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	
CONDICIONES DIFERENCIALES Y DE VULNERABILIDAD	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVLIZADO	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiaros no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

G. ACTIVIDADES REALIZADAS	
1.	Actividad ejecutada con proyecto: NOMBRE DEL PROYECTO*: Desarrollo e innovación de la cobertura de servicios públicos de energía eléctrica en el Departamento del Tolima BPIN: 2024004730025 ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN: Realizar instalación de punto lumínicos DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS:

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 3 de 7
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

G. ACTIVIDADES REALIZADAS	
	En el marco de la ejecución del proyecto “Desarrollo e innovación de la cobertura de servicios públicos de energía eléctrica en el Departamento del Tolima”, se adelantaron acciones orientadas a la instalación y puesta en funcionamiento de puntos lumínicos, contribuyendo al fortalecimiento de la infraestructura de alumbrado y a la mejora de las condiciones de iluminación y seguridad en sectores de interés para la comunidad. Para el presente periodo se reporta la instalación de ciento siete (107) puntos lumínicos, correspondientes a intervenciones realizadas en los municipios de Flandes y Chaparral, así: Municipio de Flandes: se reporta la instalación de sesenta y seis (66) puntos lumínicos, con los cuales se da continuidad al avance registrado en el reporte anterior, en el que ya se habían impactado sesenta y cinco (65) puntos lumínicos. Municipio de Chaparral: se reporta la instalación de cuarenta y un (41) puntos lumínicos en el corredor vial Tuluní, como parte de las intervenciones desarrolladas para el mejoramiento de las condiciones de iluminación de este sector. DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO: Durante el periodo reportado se verificó la instalación y puesta en funcionamiento de ciento siete (107) puntos lumínicos, distribuidos en los municipios de Flandes y Chaparral. En Flandes, se completó la intervención de sesenta y seis (66) puntos lumínicos correspondientes al avance del periodo, dando continuidad a los sesenta y cinco (65) puntos lumínicos reportados en el corte anterior. En Chaparral, se instalaron cuarenta y un (41) puntos lumínicos en el corredor vial Tuluní, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de iluminación de este corredor. En conjunto, las intervenciones realizadas contribuyen al cumplimiento de la actividad del Plan de Acción relacionada con la instalación de puntos lumínicos, fortaleciendo la infraestructura de alumbrado y mejorando las condiciones de iluminación para la población beneficiaria.
2.	Actividad ejecutada por gestión institucional o por parte del recurso humano de la dependencia, no recursos de inversión. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS: En el marco de las acciones de seguimiento y gestión institucional adelantadas por la dependencia, se realizó el acompañamiento, verificación y consolidación de la información relacionada con la instalación de puntos lumínicos ejecutados en diferentes sectores del departamento. Para el presente periodo se consolidó información correspondiente a la instalación de ciento siete (107) puntos lumínicos, distribuidos de la siguiente manera: Flandes: sesenta y seis (66) puntos lumínicos, correspondientes a la continuidad de la intervención reportada en el periodo anterior, en el cual se habían registrado sesenta y cinco (65) puntos lumínicos. Chaparral: cuarenta y un (41) puntos lumínicos instalados en el corredor vial Tuluní. Las actividades de gestión institucional estuvieron orientadas al seguimiento de las intervenciones, verificación de los avances reportados y consolidación de la información necesaria para evidenciar el cumplimiento de las acciones relacionadas con la instalación de puntos lumínicos.

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 4 de 7
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

G. ACTIVIDADES REALIZADAS	
	fortaleciendo la oferta de espacios públicos para el deporte y la recreación, promoviendo hábitos de vida saludable y mejorando la calidad de vida de la población beneficiaria. ACTIVIDADES REALIZADAS Como resultado de las acciones de seguimiento y gestión institucional, se consolidó el avance correspondiente a ciento siete (107) puntos lumínicos instalados, de los cuales 66 corresponden al municipio de Flandes y 41 al municipio de Chaparral, en el corredor vial Tuluní. Estas acciones permiten realizar el seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas y consolidar los resultados obtenidos en materia de ampliación y fortalecimiento de la infraestructura de iluminación en el Departamento del Tolima.

Nota: El formato está diseñado para permitir el registro de múltiples actividades. El usuario puede insertar o diligenciar la cantidad de filas que considere necesarias para describir de manera integral y detallada el avance físico de la meta de producto.

- Si el cumplimiento de la meta se da con la ejecución de un proyecto, la actividad debe corresponder a la establecida en la actividad del plan de acción del proyecto y diligenciar el nombre del proyecto y el BPIN.
- Si el cumplimiento de la meta se logra por gestión institucional, indicar la entidad que apoyó su desarrollo y en lo posible el recurso ejecutado
- Si el cumplimiento se da con acciones realizadas con el recurso humano de la dependencia, indicar detalladamente las actividades desarrolladas por el equipo de trabajo para el cumplimiento de la meta. En este caso NO es obligatorio diligenciar los campos de Nombre del Proyecto. Código BPIN y Actividad específica del Plan de Acción del proyecto.

H. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR * RP**
Flandes	Se entregaron 131 puntos lumínicos	\$ 1.291.617.056,00
Chaparral	Se instalaron 41 puntos lumínicos	\$ 458.651.830,00
TOTAL, EJECUTADO		\$ 1.750.268.886,00

*: solo si aplica.

RP*: registro presupuestal.

I. EVIDENCIAS

La Secretaría de Infraestructura y Hábitat, a través de la Dirección de Hábitat, CERTIFICA que el proyecto cuyo objeto es: “Celebrar contrato interadministrativo con la Empresa Generadora de Energía del Tolima EGETSA S.A. E.S.P., para la construcción de redes de media y baja tensión para alumbrado público en la vía Paradero y Margaritas del municipio de Flandes – Tolima”, celebrado entre LA GOBERNACION DEL TOLIMA y la Empresa Generadora de Energía del Tolima – EGETSA S.A. E.S.P., correspondiente al Contrato Interadministrativo No. 3665 de 2025, presenta a la fecha un avance del cien por ciento (100%) en la ejecución de las actividades contractuales.

En desarrollo del contrato, se ha realizado la instalación parcial de luminarias LED para alumbrado público rural, conforme a las especificaciones técnicas establecidas, como parte de la construcción de redes de media y baja tensión previstas en el alcance contractual.

Las actividades ejecutadas corresponden a la instalación de puntos lumínicos LED en las

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 5 de 7
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

veredas Paradero y Margaritas del municipio de Flandes – Tolima, encontrándose los puntos intervenidos operativos y en funcionamiento.

El proyecto contempla un total de ciento treinta y un (131) puntos lumínicos, de los cuales se certifica la ejecución del 100%, quedando pendiente la ejecución del porcentaje restante conforme al cronograma contractual.

La ejecución parcial certificada contribuye al mejoramiento del servicio de alumbrado público rural, fortaleciendo las condiciones de seguridad vial, movilidad y bienestar de la población en las zonas intervenidas.

NOTA: En el anterior reporte se habían impactado 65 puntos lumínicos, por ende, para el presente reporte se impacta el restante. 66 Puntos lumínicos.



"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."


	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 6 de 7
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

Meta: 66 puntos lumínicos

2. El suscrito supervisor del proyecto PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA certifica

Que las actividades relacionadas a continuación corresponden a la instalación de luminaria sobre la avenida Tuluni del municipio de Chaparral – Tolima, asociada al SUB-PROYECTO "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".


ACTIVIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR EJECUTADO ACUMULADO
ALUMBRADO PÚBLICO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION KIT DE LUMINARIA SOLAR	41	\$ 458.651.830,00
TOTAL			\$ 458.651.830,00

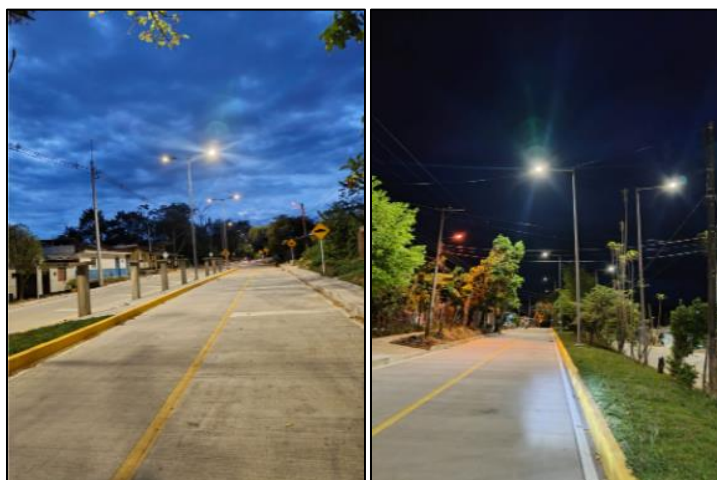

Meta: 41 puntos lumínicos

AVANCE TOTAL A REPORTAR DE LA META VIGENCIA 2026: 107 puntos lumínicos

Cordialmente,



SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
Secretaria de Infraestructura y Hábitat

Elaborado: Tania Bohórquez – Contratista SIH

Revisado y Reportado por: Diana Cifuentes – Directora de Hábitat

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 7 de 7
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

Control de Cambios

FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO	VERSION
28/06/2022	Primera Emisión Formal del Formato Único para el cargue de la información en el aplicativo Ejecutor Tolima	01
08/04/2026	Se actualizó la codificación del proceso y las tablas de información en el formato, asegurando consistencia, claridad y alineación con los estándares documentales vigentes	02
