

**INFORME GENERAL SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA
EDAT S.A E.S. P OFICIAL
CORTE MES DE JULIO-AGOSTO DE 2019**

1. META E4P10MP19 “Construcción y/o ampliación de un relleno sanitario”.

El contrato No. 139 del 6 de diciembre de 2018 cuyo objeto “AMPLIACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL PACANDE MUNICIPIOS DE NATAGAIMA Y COYAIMA DEL TOLIMA (FASE 1)” por un valor de \$2.700.401.694,68 y con un plazo de 7 meses de ejecución a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, a la fecha tiene un **100%** de avance, se están realizando las pruebas de calibración de la báscula.



2. META E4P10MP21 “Mejoramiento y/u optimización de 4 sistemas de acueducto en los sectores rurales del departamento del Tolima.”

BILBAO – PLANADAS: el contrato No.141 del 10 de diciembre de 2018 cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO VEREDAL DEL CENTRO POBLADO BILBAO DEL MUNICIPIO DE PLANADAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA FASE I”, por un valor de \$3.131.831.324,53 y un plazo inicial de 12 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, con acta de inicio del 28 de enero de 2019 a la fecha lleva un **43%** de ejecución física.

El día 10 de agosto se realizó socialización del proyecto Construcción del Plan Maestro de Acueducto veredal para Bilbao, centro poblado de Planadas. A través del acercamiento con la comunidad; representantes de la alcaldía, interventoría,

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8
Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864
e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co
Ibagué – Tolima – Colombia

AM

contratista de obra y de la EDAT se tocaron temas acerca del proyecto, beneficio y avances.



HERRERA-RIOBLANCO: En Comité Directivo No. 52 realizado el 25 de junio de 2019 se aprobaron los recursos y ejecutor para el proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE HERRERA DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO" por valor de \$4.258.539.385.

El 2 de julio de 2019 se expide por parte del Gobernador del departamento y soportada en la recomendación del comité técnico la **viabilidad** del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO VEREDAL DEL CENTRO POBLADO BILBAO DEL MUNICIPIO DE PLANADAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA FASE I" cuya contratación será ejecutada por la EDAT S.A E.S. P OFICIAL.

Se encuentra en etapa precontractual con la elaboración el borrador de los pliegos de condiciones.

CASTILLA-COYAIMA: En Comité Directivo No. 53 se aprobaron los recursos y ejecutor para el proyecto denominado "Optimización sistema de acueducto del centro poblado de Castilla, municipio de Coyaima" por valor de \$ 2.562.701.063

CERRO GORDO- MARIQUITA: Se terminan las obras del contrato No 050-1 del 03 de marzo de 2014 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL PIEDRAS NEGRAS, CERRO GORDO Y ALTO RICO DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" por valor total de \$1.999.601.971,80, beneficiando a 154 usuarios. Se encuentra liquidado.

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8

Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864

e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima – Colombia

3



VARSOVIA-CUNDAY: Se terminan las obras del contrato No 120 del 12 de diciembre de 2013 cuyo objeto es “OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE VARSOVIA Y DE LA VEREDA MESETA DEL MUNICIPIO DE CUNDAY” por un valor de \$1.307.604.226 beneficiando a 113 usuarios de las dos comunidades. Actualmente se encuentra en proceso de liquidación.

DANUBIO, CUATRO ESQUINAS - AMBALEMA: Se ejecuta el contrato PAF-ATF-O-153 del 2015 cuyo objeto es “CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CONDUCCION DE LA FUENTE ALTERNA POR GRAVEDAD DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS EL DANUBIO Y 4 ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE AMBALEMA” como parte de un convenio interadministrativo de cooperación técnica y apoyo financiero celebrado entre el Ministerio De Vivienda, Ciudad y Territorio, La Financiera De Desarrollo Territorial S.A FINDETER, la empresa de acueducto alcantarillado y aseo del tolima EDAT SA ESP Oficial y el municipio de Ambalema- Departamento del Tolima por un valor de \$1.599.001.089 de los cuales \$161.173.813 son recursos del PDA.

3. META E4P10MP22 “Mejoramiento y/u optimización de 9 sistemas de acueducto en los sectores urbanos del departamento del Tolima”.

PLANADAS: El proyecto denominado “REALIZAR OBRAS CIVILES PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PLANADAS” se encuentra un **100%** de avance de ejecución de las obras.

La PTAP convencional ya se encuentra en operación y la PTAP compacta se le están realizando las pruebas de funcionamiento y puesta en marcha, se está a la espera del concepto favorable de la interventora, para proceder con el acta de terminación.

Soluciones que transforman


Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8

Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864

e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima – Colombia



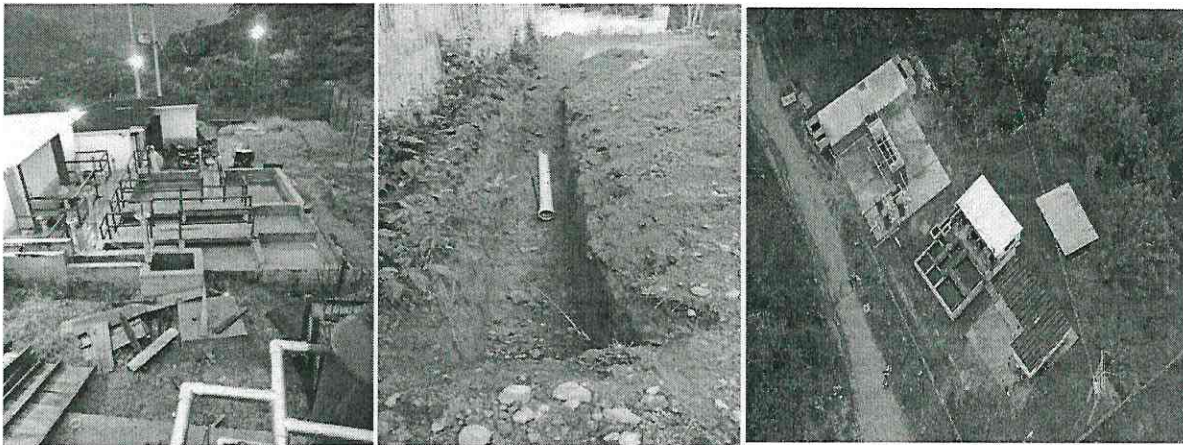

VILLAHERMOSA: Se recibe concepto favorable de parte del MVCT para la reformulación del proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGÚN PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" la cual se solicitó por temas técnicos cuando el proyecto ya se encontraba con un **25%** de avance físico de obra. El 12 de agosto de 2019 se firma el acta de reinicio del contrato de obra e interventoría y se inician actividades preliminares.

CUNDAY: El contrato No. 134 del 16 de octubre de 2018 cuyo objeto es "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CUNDAY TOLIMA" con un plazo de ejecución de 6 meses y un valor de \$1.905.235.732. Se suscribe acta de inicio el día 10 de enero de 2019. El Contrato de obra lleva un avance físico del **20%**, este proyecto beneficiara a 2.765 habitantes. Actualmente se encuentra en estructuración la reformulación al proyecto por parte del contratista de obra.

ARMERO-GUAYABAL: El contrato No.128 del 25 de septiembre de 2018 cuyo objeto es "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGÚN PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL" por un valor de \$10.225.685.303 y un plazo inicial de 10 meses. El Contrato de obra se encuentra a la fecha en un **51%** de ejecución física. Con este proyecto se benefician 11.704 personas.

GUAMO: Se ejecuta el contrato PAF-ATF-081 del 2013 cuyo objeto es "OPTIMIZACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE EL GUAMO" como parte de un convenio interadministrativo de cooperación técnica y apoyo financiero celebrado entre el Ministerio De Vivienda, Ciudad y Territorio, La Financiera De Desarrollo Territorial S.A FINDETER, la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT SA ESP Oficial y

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8

Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864

e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima – Colombia

m

el municipio de el Guamo - Departamento del Tolima por un valor de \$10.421.971.866 de los cuales \$1.098.000.000 fueron recursos PDA. Se realizaron actividades en la captación y aducción, mejoramiento estructural del desarenador, instalación de tuberías en la línea de conducción, optimización de la PTAP, Construcción de lechos de secado, construcción de tanque elevado e instalación de tuberías en las redes de distribución. El 19 de noviembre de 2018 el municipio de Guamo recibió el proyecto mediante acta suscrita por el alcalde municipal, Findeter e interventoría. El 7 de febrero de 2019 se suscribe acta de liquidación del contrato de obra.

SAN ANTONIO: Se ejecuta el contrato PAF-ATF-129 del 2015 cuyo objeto es "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO- DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" como parte de un convenio interadministrativo de cooperación técnica y apoyo financiero celebrado entre el Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio, La Financiera De Desarrollo Territorial S.A FINDETER, Gobernación del Tolima, la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT SA ESP Oficial y el municipio de San Antonio No. 170 del 8 de noviembre de 2013 por un valor total de \$2.468.259.612 de los cuales \$209.518.294 son con recursos del PDA. se realizaron actividades como optimización de bocatomas, mejoramiento estructural de desarenadores, optimización de línea de aducción y conducción y optimización redes de distribución. Se encuentra finalizado y en proceso de liquidación.

CAJAMARCA: En el Comité Directivo No.52 se aprobaron los recursos para el proyecto denominado "OPTIMIZACIÓN DE REDES DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA" por un valor de \$2.099.837.582.

VALLE DEL SAN JUAN: El proyecto denominado "OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA VALLE DE SAN JUAN" por un valor de \$7.374.436.741,64 Millones de pesos, se encuentra en proceso precontractual en la plataforma SECOP I. Actualmente ya se encuentra publicado el informe de evaluación de las ofertas presentadas.

ANZOATEGUI: En el Comité Directivo No.53 se aprobaron los recursos para el proyecto denominado "Construcción del plan maestro de acueducto del municipio de Anzoátegui" por un valor de \$ 2.770.000.000.

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8

Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864

e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima – Colombia


4. META E4P10MP24 “Construcción de 3 sistemas de acueducto del sector rural del departamento”.

SANTA MARTA- COYAIMA: El proceso precontractual del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SANTA MARTA, INSPECCIÓN DEL MUNICIPIO DE COYAIMA – TOLIMA” por un valor de \$2.604.000.000 millones de pesos se encuentra actualmente se encuentra en subsanación de las observaciones a la evaluación técnica de las propuestas presentadas. El proceso de contratación de este proyecto se realiza con los requisitos del BID.

VEGA DE GRAMAL - ALPUJARRA: El proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA VEGA DE GRAMAL, DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA – TOLIMA” por un valor de \$5.452.000.000 millones de pesos se encuentra actualmente se encuentra en subsanación de las observaciones a la evaluación técnica de las propuestas presentadas. El proceso de contratación de este proyecto se realiza con los requisitos del BID.

5. META E4P10MP25 “Mejoramiento y/u optimización de 2 sistemas de alcantarillado en los sectores urbanos del departamento del Tolima”.

ATACO: El proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATACO TOLIMA” en ejecución mediante contrato de obra No.125 del 11 de septiembre de 2018 por un valor de \$11.941.501.102 y un plazo inicial de 12 meses. El Contrato de obra a corte de junio de 2019 tiene un avance físico del 63% con este proyecto se beneficiarán 5.189 habitantes.

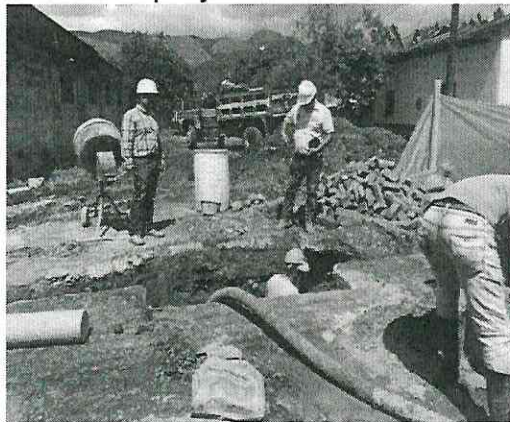

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8
Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864
e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co
Ibagué – Tolima – Colombia

12

6. META E4P10MP26 “Mejoramiento y/u optimización de 3 sistemas de alcantarillado en los sectores rurales del departamento del Tolima”.

CASTILLA-COYAIMA: La EDAT S.A. E.S.P Oficial, dando cumplimiento a sus funciones y apoyo a la entidades municipales, ejerce la supervisión técnico ejecutiva del contrato de Obra No 340 del 28 de Diciembre de 2018 Suscrito entre el Municipio de Coyaima y Consorcio Redes Coyaima que tiene por Objeto “OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLA, MUNICIPIO DE COYAIMA FASE 1” por un valor de CUATRO MIL TRESCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$4.301.650.864), con un plazo de ejecución de 9 meses, se tiene un avance de **28%**. Con el fin de hacer seguimiento a avances y ejecuciones de obras, desde el área técnica de la entidad, se realizó visita el 13 de agosto de 2019. Se han realizado actividades de suministro e instalación de tubería de 6”, Construcción de 50 cajas de inspección, excavaciones, rellenos.

CHICORAL- ESPINAL: En el Comité Directivo No. 52 se aprobaron los recursos para el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL PLAN DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE CHICORAL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL” por un valor de \$7.393.349.530 millones de pesos.

LA URIBE-RIOBLANCO: Contrato No.1361 del 2016 denominado “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO FISICO DE LA VEREDA LA URIBE SECTOR CENTRO POBLADO MUNICIPIO DE RIOBLANCO- TOLIMA (MEJORAMIENTO DE VIAS, PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLAS TIPO INVIAS, SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE) por un valor de \$1.246.514.191, se realizaron actividades como la separación del sistema de aguas residuales y aguas lluvias, construcción de toda la red de alcantarillado desde su punto de recepción hasta el punto de entrega a la PTAR y la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR.

MARACAIBO-RIOBLANCO: el contrato No.119 del 2 de diciembre de 2013 denominado “CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA MARACAIBO DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA” con un valor inicial de \$ 327.414.027,50 a los cuales se adicionaron \$ 64.436.99,18 en esta vigencia con el fin de poder finalizar las obras se encuentra al **100%** de ejecución física.

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8

Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864

e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima – Colombia



7. META E4P10MP27 “Fortalecer Institucionalmente 42 municipios prestadores directos de servicios públicos, Empresas de Servicios Públicos (ESP) de acueducto, alcantarillado y aseo del departamento del Tolima.”

El “PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS” contratado mediante el contrato No. 002 del 23 de enero de 2019 cuyo objeto es “CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA EL DIAGNOSTICO, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL PAP-PDA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” por un valor total de \$6.310.808.000, se encuentra con un **69%** de ejecución total.

Los municipios priorizados por este plan son: Alpujarra, Alvarado, Ambalema, Anzoátegui, Armero-Guayabal, Ataco, Cajamarca, Casabianca, Coello, Coyaima, Cunday, Falan, Flandes, Fresno, Guamo, Herveo, Líbano, Murillo, Natagaima, Ortega, Palocabildo, Piedras, Planadas, Prado, Purificación, Rioblanco, Roncesvalles, Rovira, Saldaña, San Antonio, San Luis, Santa Isabel, Suarez, Valle De San Juan, Venadillo, Villahermosa, Villarrica.

Se han realizado actividades de fortalecimiento institucional en los aspectos legales, comerciales, financieros y operativos, jornadas de vigilancia y limpieza de fuentes abastecedoras, creación de comités de desarrollo y control social y capacitación en competencias laborales dirigida a los fontañeros y operarios de PTAR y PTAP.

También se comenzó un proceso de certificación en competencias laborales dirigido a los operarios de PTAP y PTAR esto con el fin de lograr la respectiva certificación en las normas 280201221 “Potabilizar agua de acuerdo con normas técnicas” y 280201220 “Manejar sistema de captación de agua de acuerdo con normas técnicas”

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8
Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864
e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co
Ibagué – Tolima – Colombia

13

8. META DE PRODUCTO (E1P1MP58): 400 niños, niñas y adolescentes vinculados en el Club amigos del Agua.

Se suscribe el convenio No. 1336 del 17 de junio de 2019 entre la Gobernación del Tolima y la EDAT S.A. E.S.P. Oficial cuyo objeto es "CELEBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EDAT S.A E.S.P OFICIAL COMO GESTOR DEL PAP PDA PARA ALCANZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLITICA DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO IMPLEMENTANDO EL PLAN DE GESTION SOCIAL 2019 EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO CONFORME LO SEÑALADO EN EL PARAGRAFO DEL ARTICULO 2.3.3.1.4.14 DEL DECRETO 1077DE 2015" por el cual se da inicio al PLAN DE GESTIÓN SOCIAL de la entidad.

Con el inicio del PLAN DE GESTIÓN SOCIAL se reactivan las actividades en los diferentes Clubes Amigos Protectores del agua.

Lérida: se visita la I.E Técnica Colombo Alemana donde se socializa el cronograma de actividades a desarrollarse en el presente semestre.

Falan: se visita la I.E Fabio Lozano Torrijo del municipio de Falan en donde a través de actividades lúdico pedagógicas trabajaremos con el Club Amigos Protectores del Agua temas de reciclaje y uso y ahorro eficiente del recurso hídrico. Se socializó con la coordinadora de la institución educativa el cronograma a desarrollar.

Casabianca: se visita la I.E José Joaquín García en Casabianca con el fin de articular las actividades que se llevarán a cabo en el marco de la estrategia Club Amigos Protectores del Agua.

Purificación: se visita la I.E Pérez y Aldana del municipio de Purificación, en donde establecieron reunión con la coordinadora académica y con docente con el propósito de dar continuidad al Club Amigos Protectores del Agua, allí se socializó el respectivo cronograma a desarrollarse durante este semestre.

Espinal: se visitaron las instituciones educativas Felix Tiberio Guzmán y Mariano Sánchez Andrade, en aras de socializar el cronograma de actividades a desarrollar con niños y jóvenes en lo concerniente a la importancia del reciclaje y la cultura del agua.

De igual manera, se visitó la I.E Juan Pablo II sede del megacolegio en el Espinal se socializó con docentes los formatos y fichas de cada estudiante, para

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8

Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864

e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima – Colombia

la conformación del Club Amigos Protectores del Agua, en aras de continuidad al desarrollo de las actividades en la institución en el semestre II del presente año.

Ataco: se visitó la I. E técnica Martín Pomala en Ataco con el fin de articular las actividades que se desarrollarán desde la estrategia Club Amigos Protectores del Agua.

Líbano: se visitó la I.E Inmaculada Concepción del corregimiento de Convenio municipio del Líbano se realizó la socialización y reactivación del Club Amigos Protectores del Agua por parte de profesional del Plan de Gestión Social.

Honda: se visitó la I.E Alfonso López Pumarejo en donde se hizo la socialización y el respectivo proceso para la reactivación del Club Amigos Protectores del Agua, en aras de llevar un mensaje a niños y jóvenes sobre la importancia del reciclaje y el uso y ahorro eficiente del Agua.

Coyaima: se visitó la I.E Técnica Agroindustrial Juan XXIII del municipio de Coyaima en aras de avanzar en la reactivación del Club Amigos Protectores del Agua. Allí a través de un diálogo con docentes de la institución se socializa lo planeado para desarrollar durante el presente semestre en temas de reciclaje y cultura del agua.

Alvarado: se visitó la I.E General Enrique Caicedo, en donde se socializó con docentes el cronograma a ejecutar durante el semestre B del 2019; así mismo se efectuó la entrega de kits a los niños miembros del Club quienes recibirán y multiplicarán un mensaje sobre la importancia del agua para nuestras vidas.

Armero-Guayabal: se visitó la I.E Técnica Jiménez De Quesada, en donde se hizo la socialización y reactivación del Club Amigos Protectores del Agua, allí se entregó la solicitud de permiso para dar continuidad al desarrollo de las actividades en la institución para el semestre B 2019, igualmente se hace entrega de Kits para los miembros del Club.

Rioblanco: se visitó la I.E Técnica Francisco Julián Olaya, en donde profesionales del Plan de Gestión Social llevaron a cabo la socialización y reactivación del Club Amigos Protectores del Agua. Esto, con el propósito de desarrollar con éxito las actividades programadas para el semestre B de 2019 en temas de reciclaje y uso y ahorro eficiente del agua.

Ortega: se visitó la I.E John F. Kennedy en Ortega con el fin de articular las actividades que se desarrollarán desde la estrategia Club Amigos Protectores del Agua.

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8

Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864

e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima – Colombia



Chaparral: se iniciaron las actividades del Club Amigos Protectores del Agua a través del cual se desarrollaron actividades lúdicas y educativas con los estudiantes de la Escuela Urbana Gabriela Mistral. Allí, se realizó la proyección de videos pedagógicos para el uso eficiente y ahorro del agua

También se visitó la Institución Educativa Técnica Soledad Medina, sede Nuestra Señora del Rosario, donde se iniciaron las actividades del Club Amigos Protectores del Agua, en dónde se proyectaron videos acerca del uso y ahorro eficiente del agua para desarrollar con los miembros del club actividades pedagógicas de retroalimentación, alusivas al cuidado del agua y la importancia de su preservación para la vida.

Roncesvalles: se visitó la I.E La voz de la Tierra en Roncesvalles, con el propósito de dar inicio a las actividades del club amigos protectores del agua de este plantel, según el cronograma programado.

Cajamarca: se visitó la I.E Nuestra Señora del Rosario se realizó mesa de trabajo con docentes, con el fin de articular las actividades que se llevarán a cabo en el marco de la estrategia y reactivación del Club Amigos Protectores del Agua.

Anzoátegui: se visitó la I.E Técnica Carlos Blanco Nassar sede la Cabaña corregimiento de Palomar del municipio de #Anzoátegui en donde se socializó y reactivó con el coordinador y el docente encargado el club amigos protectores del agua. También, se hizo entrega de los kits a los miembros del club y se desarrollaron actividades con los estudiantes sobre el uso y ahorro eficiente del agua.

Rovira: se visitó la I.E técnica agroindustrial La Ceiba en Rovira con el objetivo de dar continuidad al Club Amigos Protectores del Agua. Allí, se hizo la socialización del cronograma de actividades a desarrollar con los miembros del club durante el presente semestre. Esto en aras de transmitir un mensaje sobre la importancia del uso y ahorro eficiente del agua.

Ambalema: se visitó la I.E Nicanor Velasquez Ortíz; visita que tuvo como fin articular para retomar actividades con el Club Amigos Protectores del agua. De igual manera, se socializó el cronograma a ejecutar durante el semestre B del 2019.

San Antonio: se visitó la I.E José María Carbonell en San Antonio. Allí, se hizo la reactivación del club y socialización del cronograma de actividades a hacerse en el presente periodo del 2019.

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8

Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864

e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima – Colombia



Murillo: se visitó la I.E Técnica Lepanto sede Francisco José de Caldas. A través de la proyección de videos institucionales alusivos al cuidado de nuestros recursos y actividades lúdico-pedagógicas, llevamos a cabo la reactivación del Club Amigos Protectores del Agua en este municipio del norte del Tolima.

Villahermosa: se visitó la I.E Normal Superior en aras de dar continuidad a la estrategia Club Amigos Protectores del Agua, allí se hizo la proyección del cronograma de actividades a desarrollar en el presente semestre del 2019.

Alpujarra: se visitó la I.E Técnica Felisa Suárez Ortiz, con el fin de realizar la socialización y reactivación del Club Amigos Protectores del Agua con directivos y docentes.

Ibagué: Con el propósito de retomar actividades enfocadas en la importancia del reciclaje y el uso y ahorro eficiente del agua, profesionales del Plan de Gestión Social llegaron a la institución educativa técnica agropecuaria Mariano Melendro sede Cay. Allí, se hizo la reactivación del Club Amigos Protectores del Agua y socialización del cronograma de actividades a desarrollarse en el presente periodo del 2019.

9. META E4P10MP28 “42 municipios fortalecidos en el programa de gestión social”

Se suscribe el convenio No. 1336 del 17 de junio de 2019 entre la Gobernación del Tolima y la EDAT S.A. E.S.P. Oficial cuyo objeto es” **CELEBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL COMO GESTOR DEL PAP PDA PARA ALCANZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLITICA DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO IMPLEMENTANDO EL PLAN DE GESTION SOCIAL 2019 EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO CONFORME LO SEÑALADO EN EL PARAGRAFO DEL ARTICULO 2.3.3.1.4.14 DEL DECRETO 1077DE 2015”** por el cual se da inicio al PLAN DE GESTIÓN SOCIAL de la entidad.

Con el inicio del PLAN DE GESTIÓN SOCIAL se reactivan las actividades en acompañamiento de obra y redes de apoyo.

Bilbao -Planadas: se llevó a cabo comité social en compañía de la veeduría y profesionales sociales para tratar puntos importantes frente al desarrollo social de la construcción de acueducto veredal en esta zona. Del mismo modo, se entregaron cartillas de participación ciudadana sobre deberes y derechos. Finalmente, se

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8

Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864

e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima – Colombia



realizó el recorrido de la ruta saludable a la planta de tratamiento de agua potable PTAP.

Armero Guayabal: se lleva a cabo comité técnico, comité social de obra y recorrido al proyecto del contrato 128 de 26 septiembre de 2018, correspondiente a la Optimización del Sistema de Acueducto según plan Maestro del municipio de Armero Guayabal.



DILEY VANESSA BARRERO
DIRECTORA TÉCNICA EDAT S.A E.S.P OFICIAL

Proyecto: ing. Camila A. Camacho, Mario Varón
Archivo: C:\Users\Acer\Dropbox\EDAT\EDAT 2019\SEGUIMIENTO DE METAS
VERSION: 00

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8
Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864
e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co
Ibagué – Tolima – Colombia

